


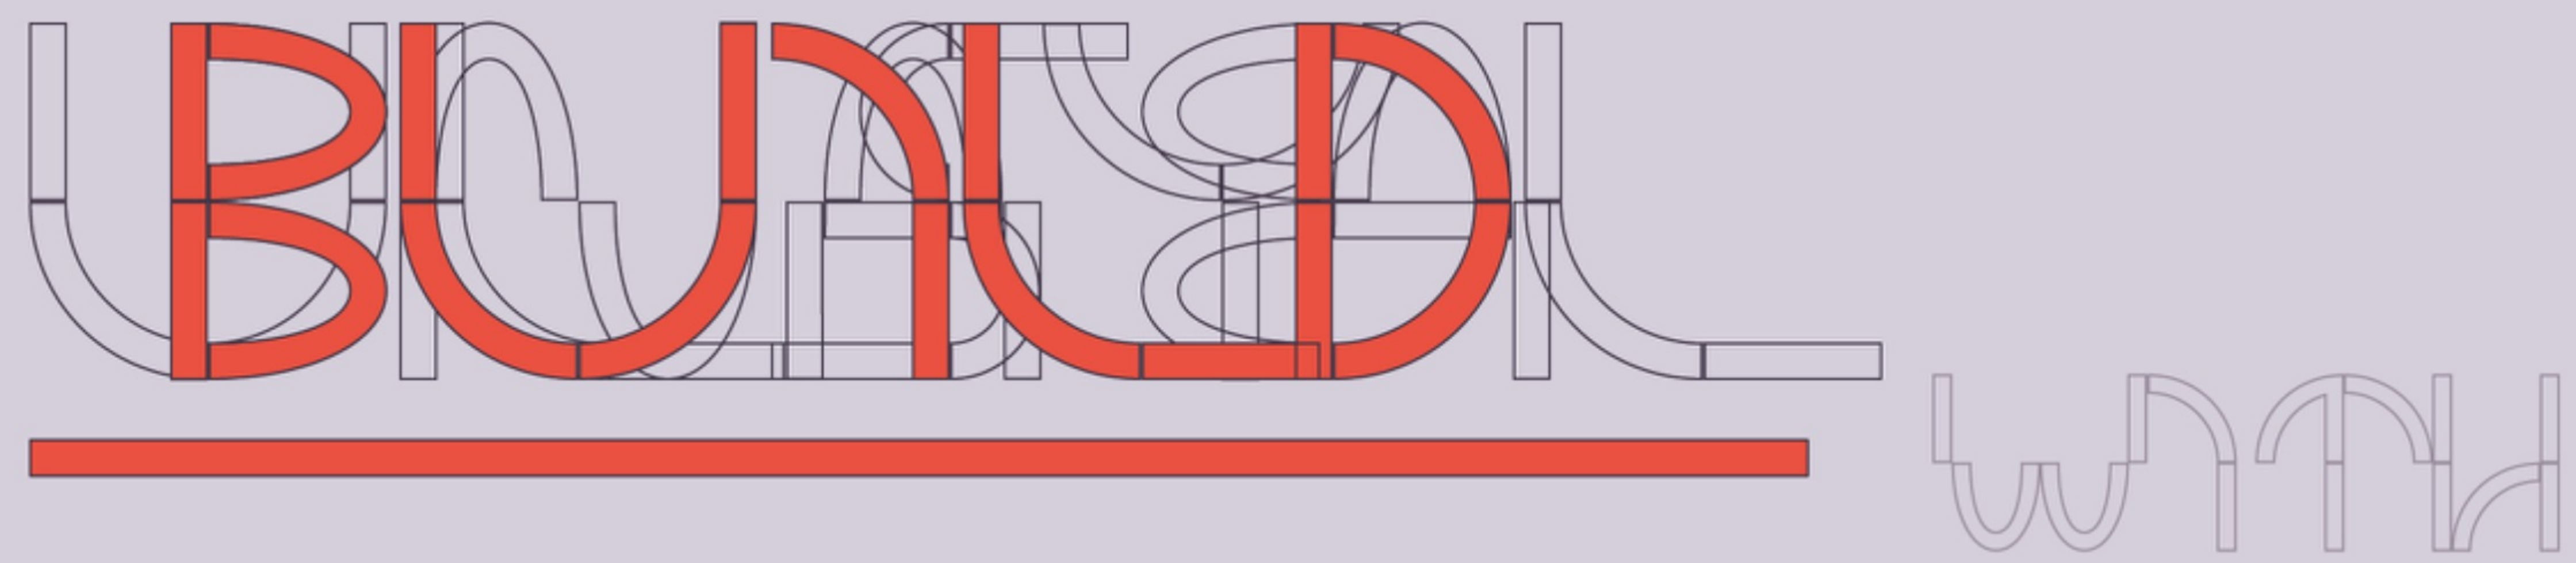

URBAN INTERVENTIONS


art
campus' street lab
+ Eröffnungsparty

22. - 24.04.2026

Universitätsstraße

save the date - more infos soon

Mehr Informationen:




DOKUMENTATION
PARTIZIPATIVER
BAUWORKSHOP






David Nil Morsi
mail@davidnilmorsi.com

Kristin Lazarova
kristin.laz@mail.de


SYNTHESE DER URBANEN INTERVENTIONEN FÜR CAMPUS.STREET.LAB
ANHAND DER ERGEBNISSE AUS DEM PARTIZIPATIVEN PROZESS




LANGE TAFEL: AUSFÜHRUNGSPLANUNG TISCH

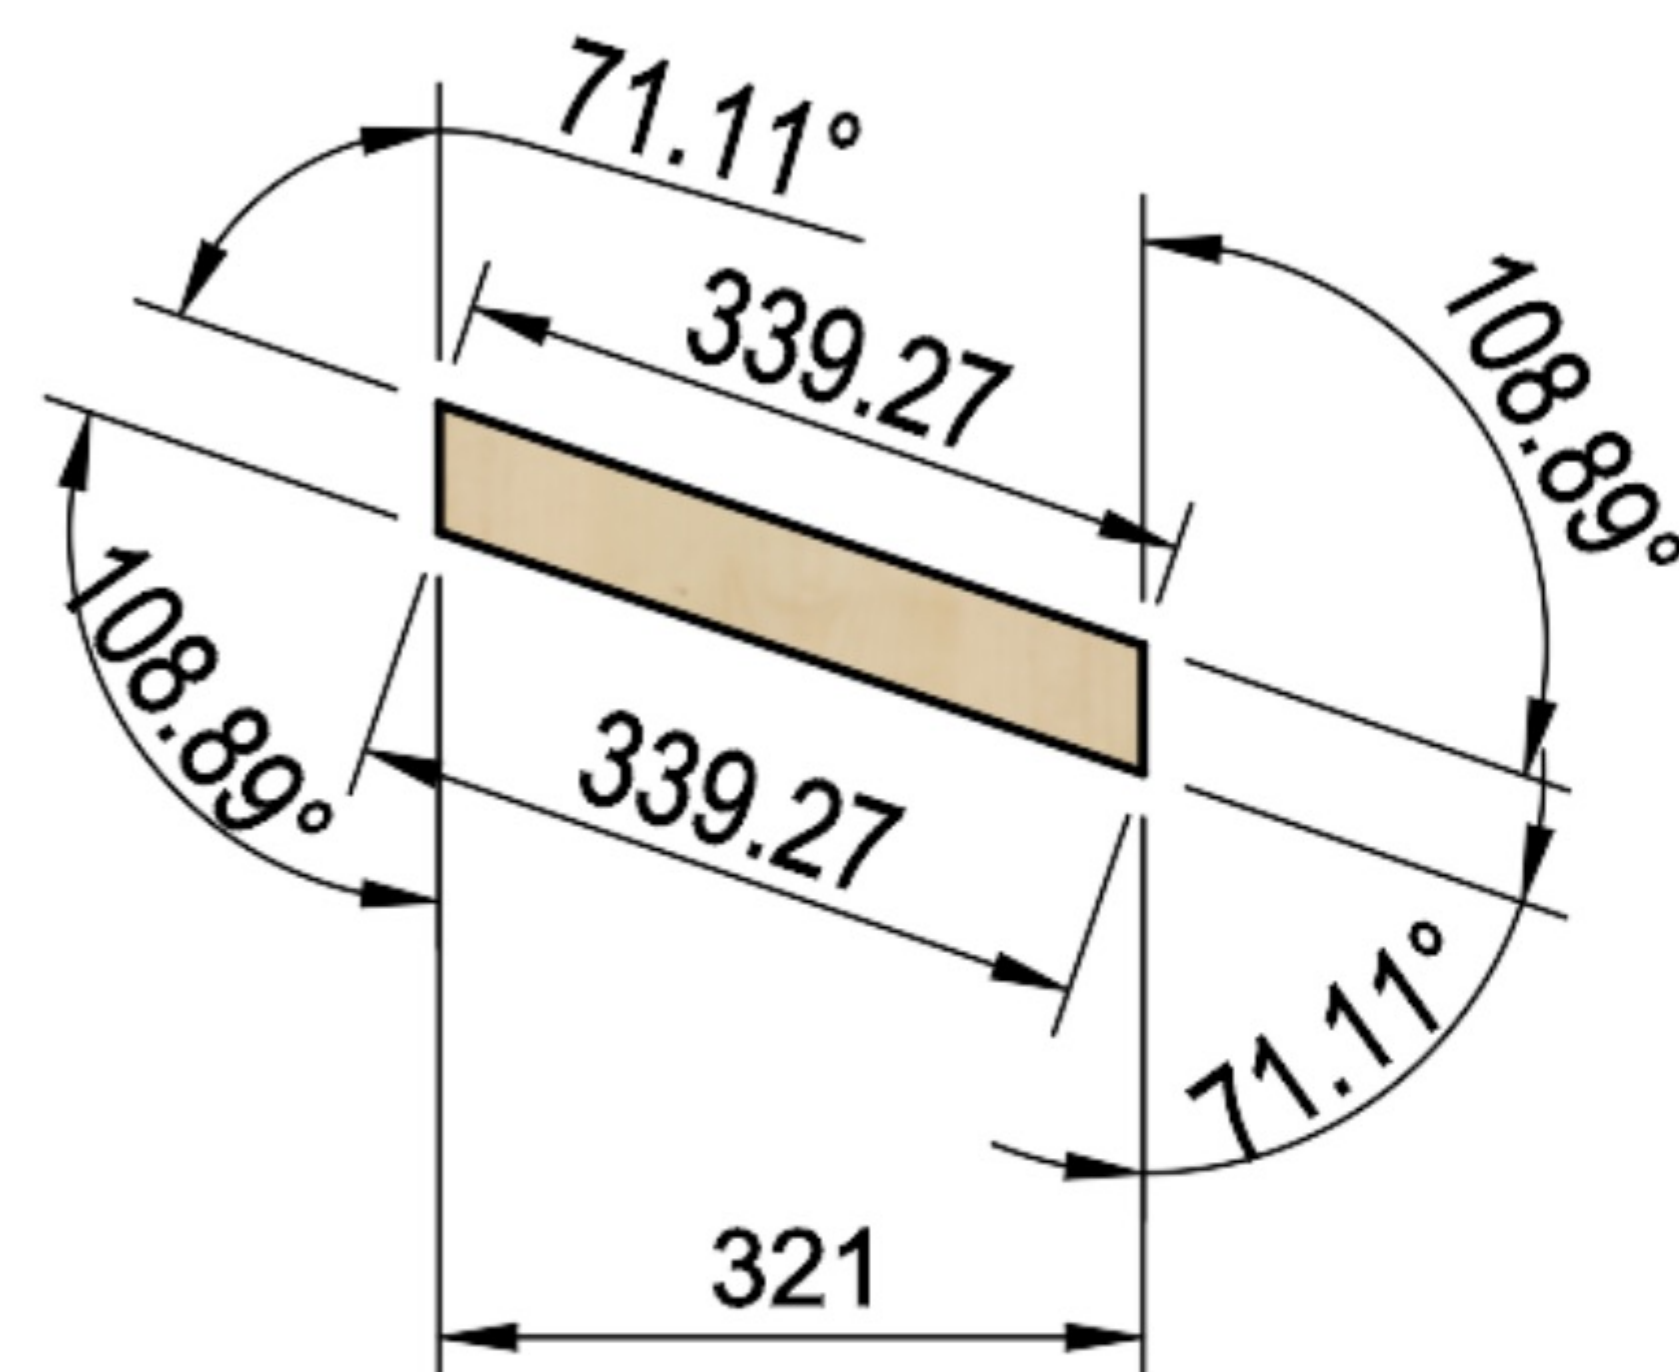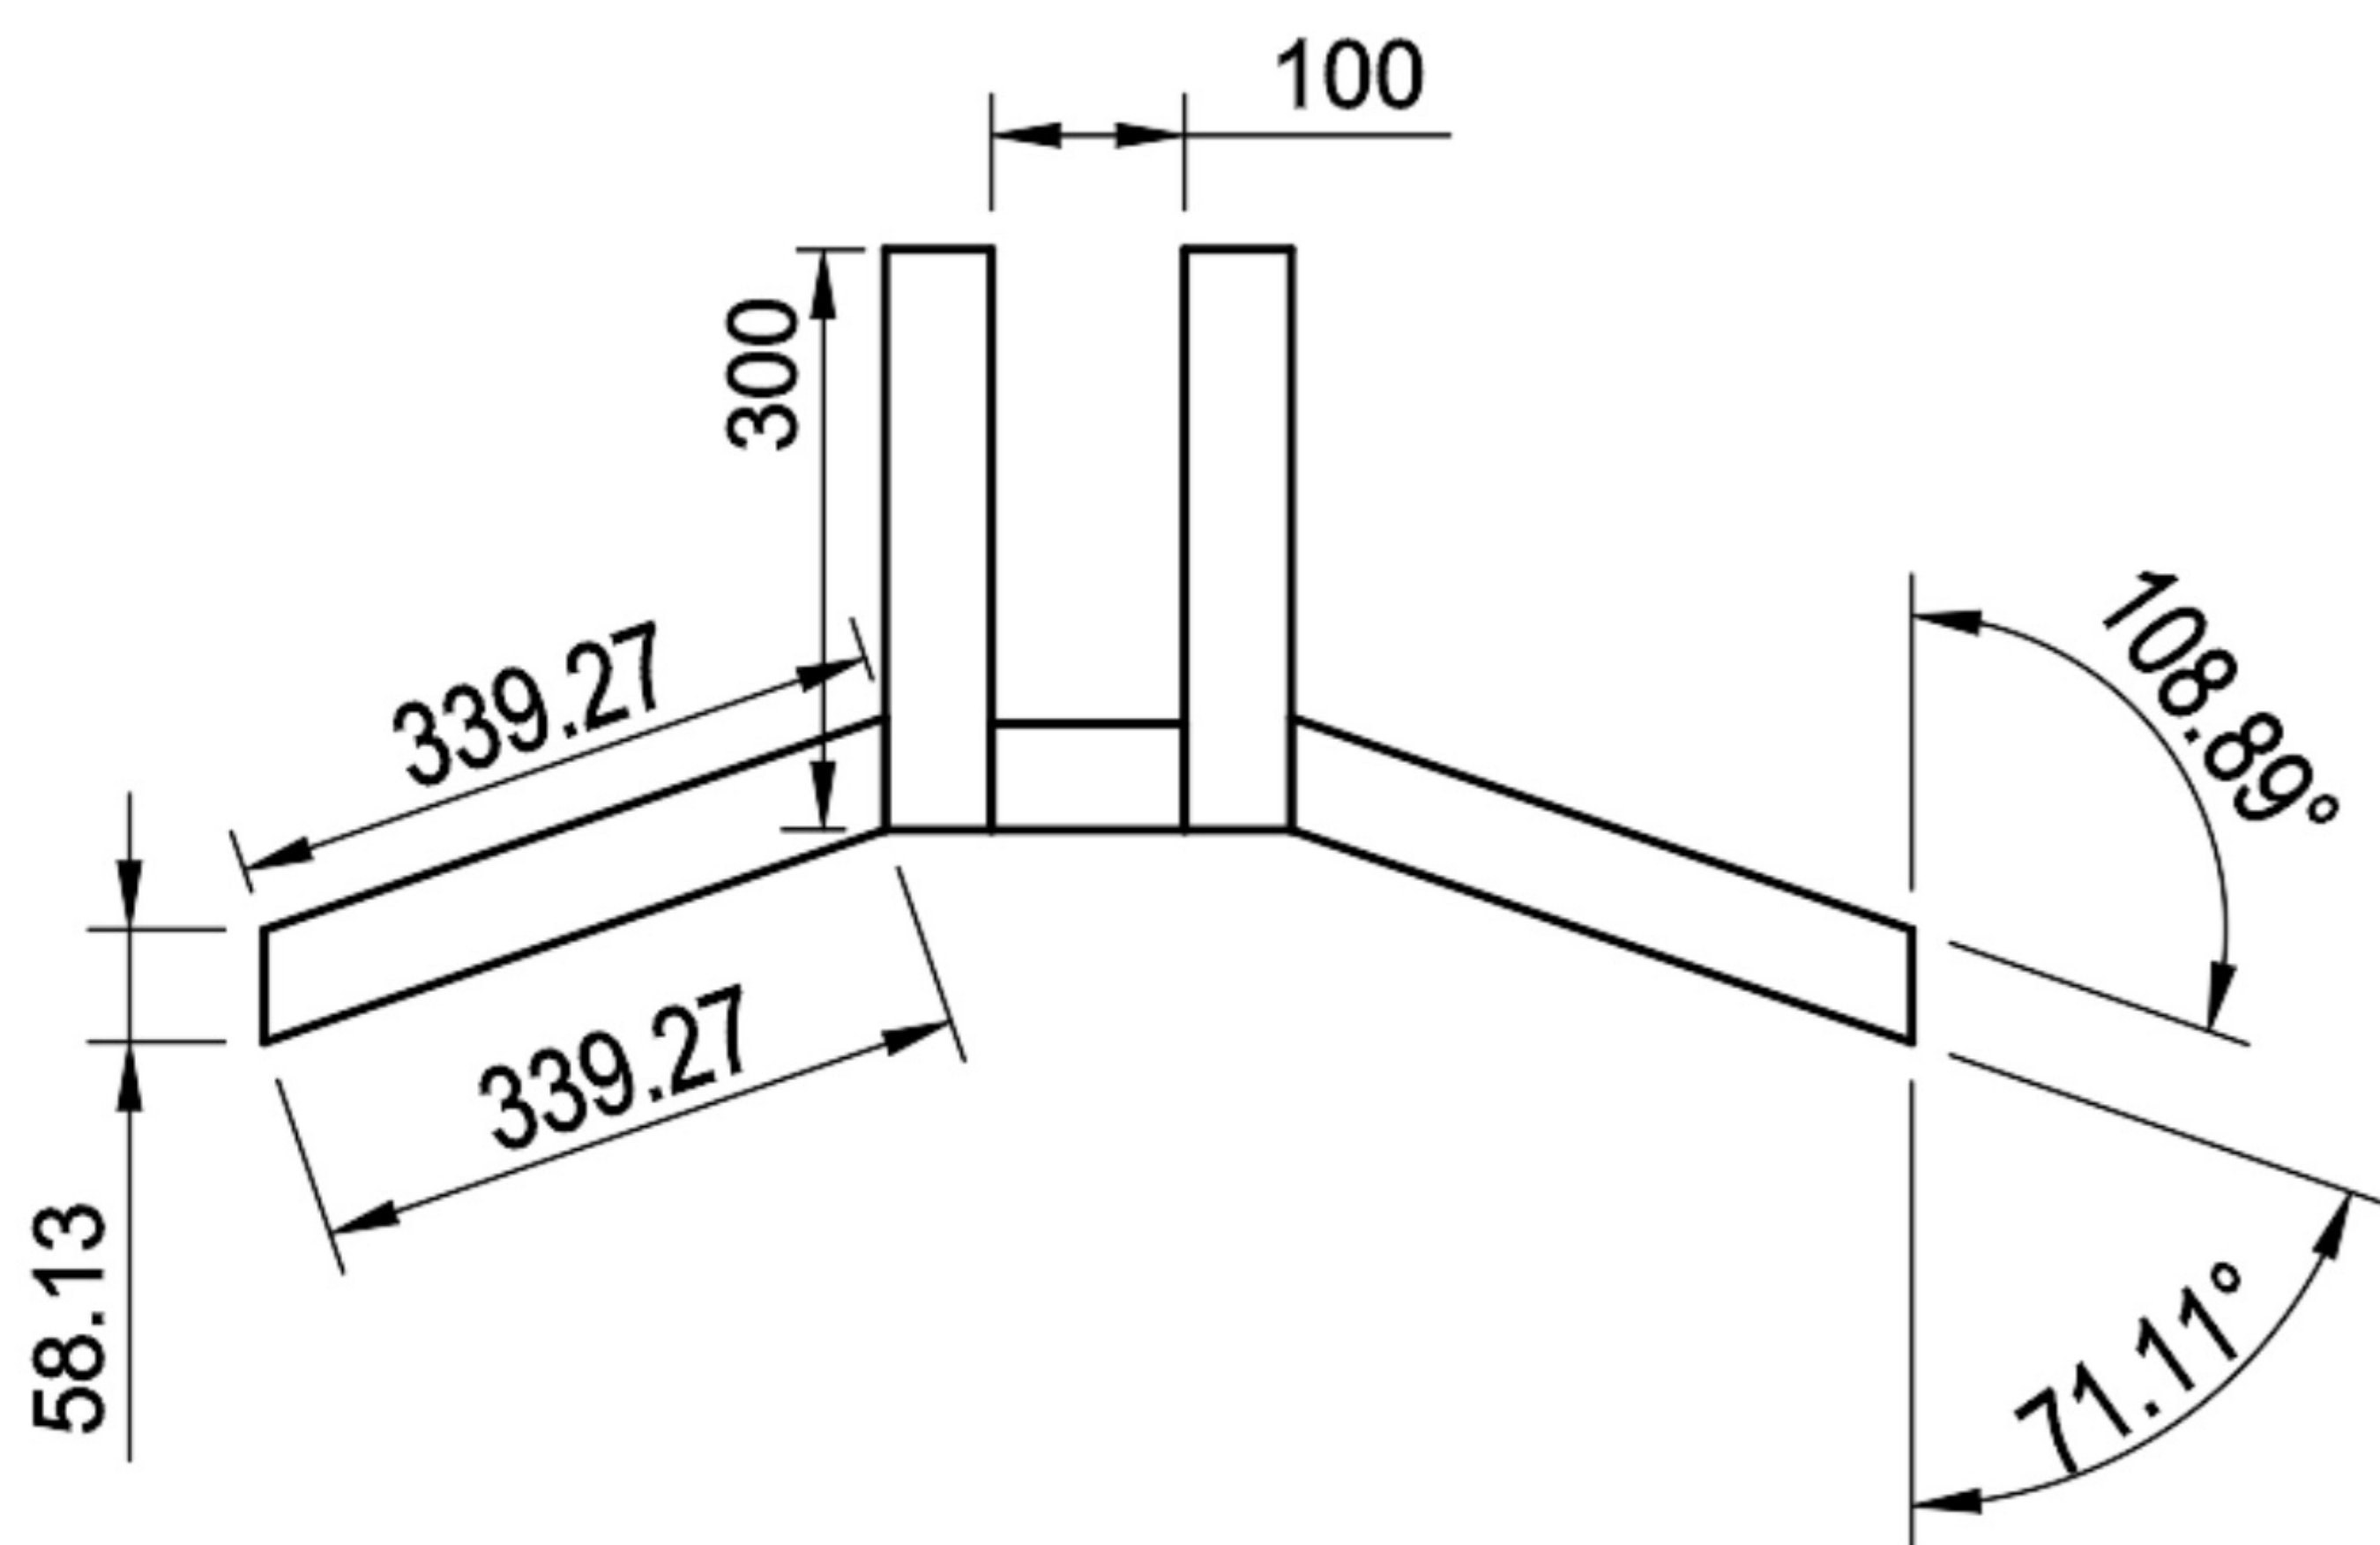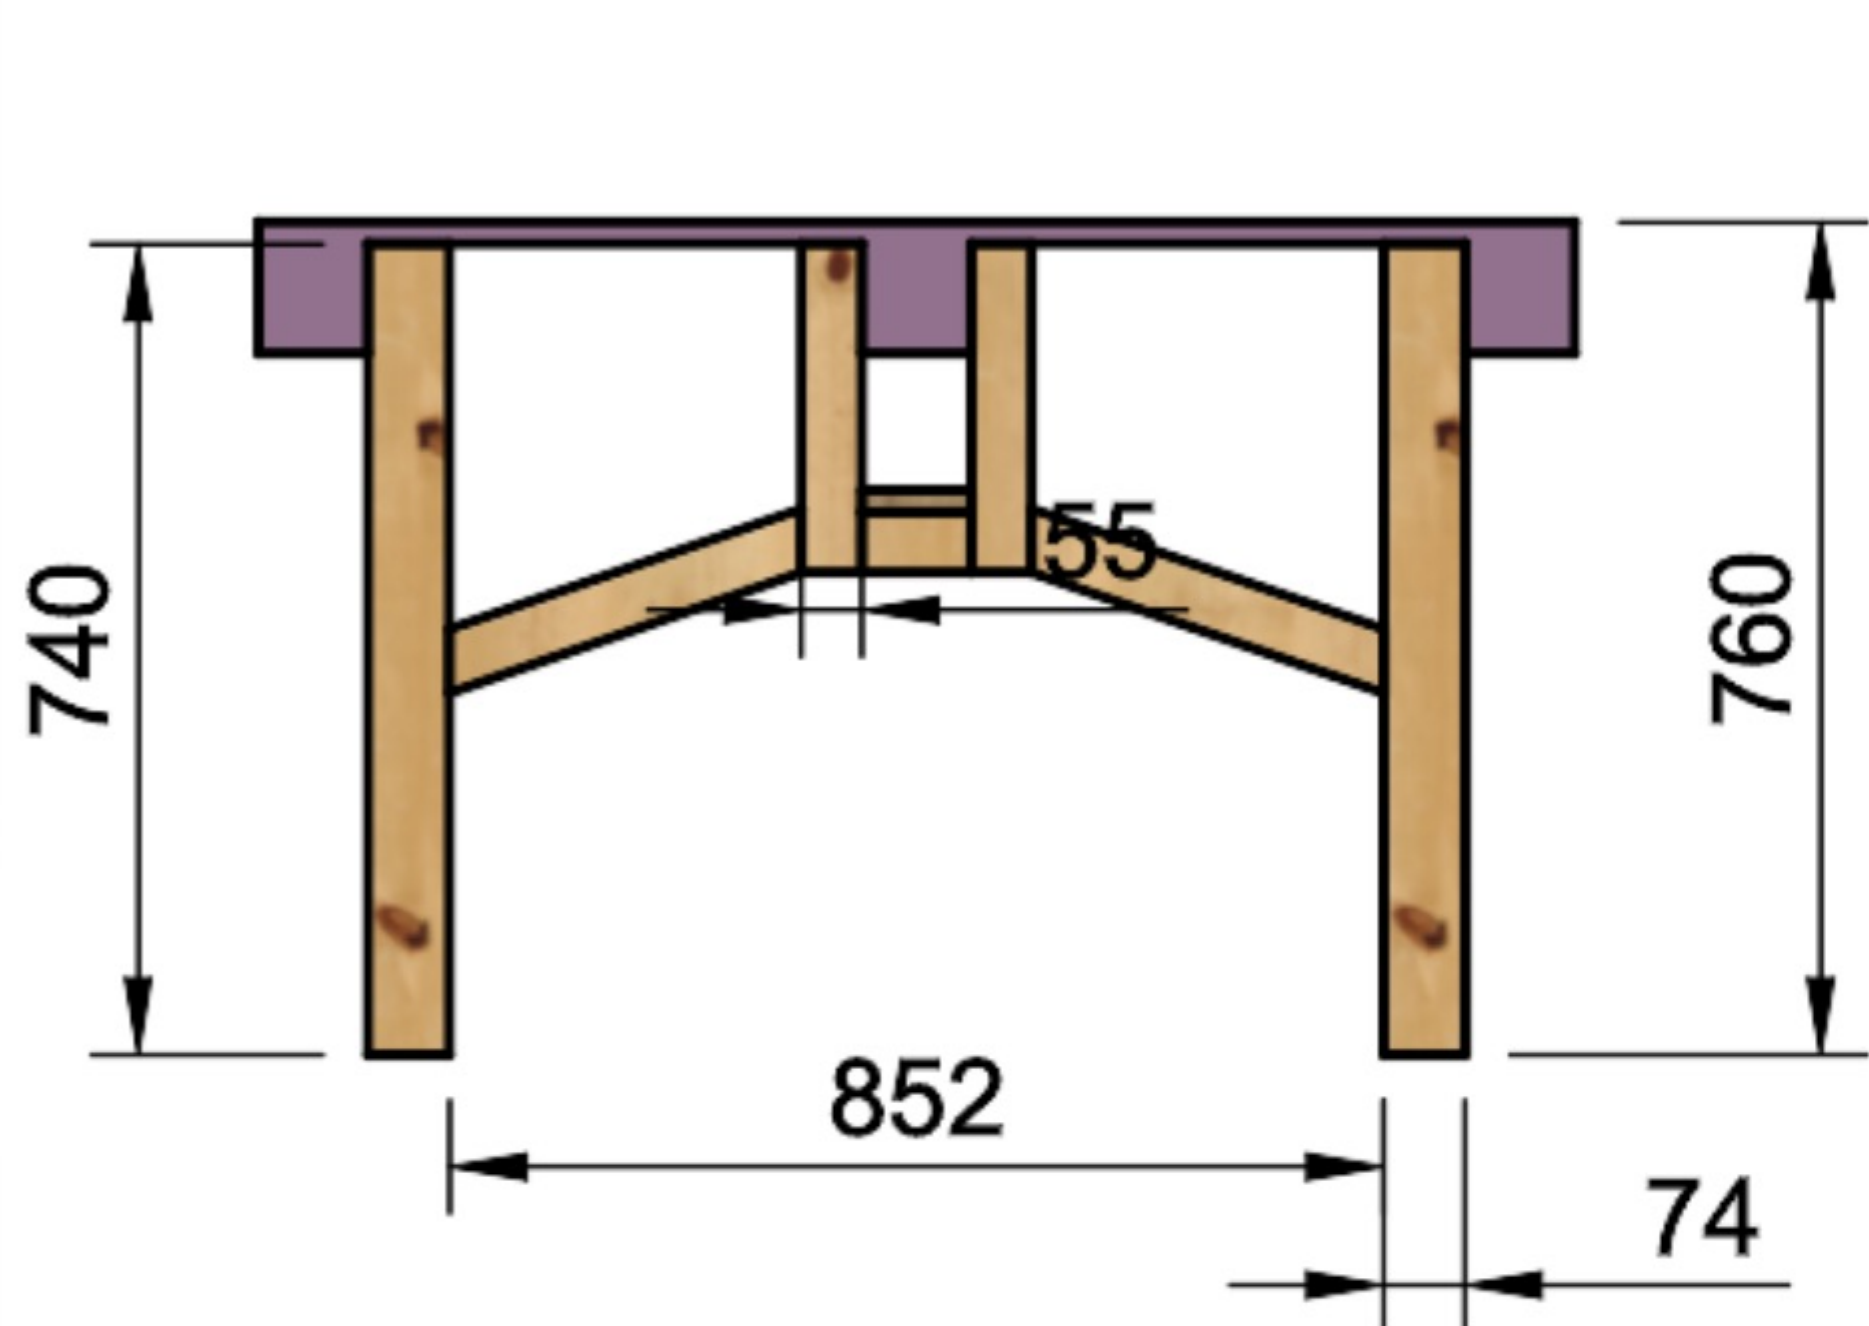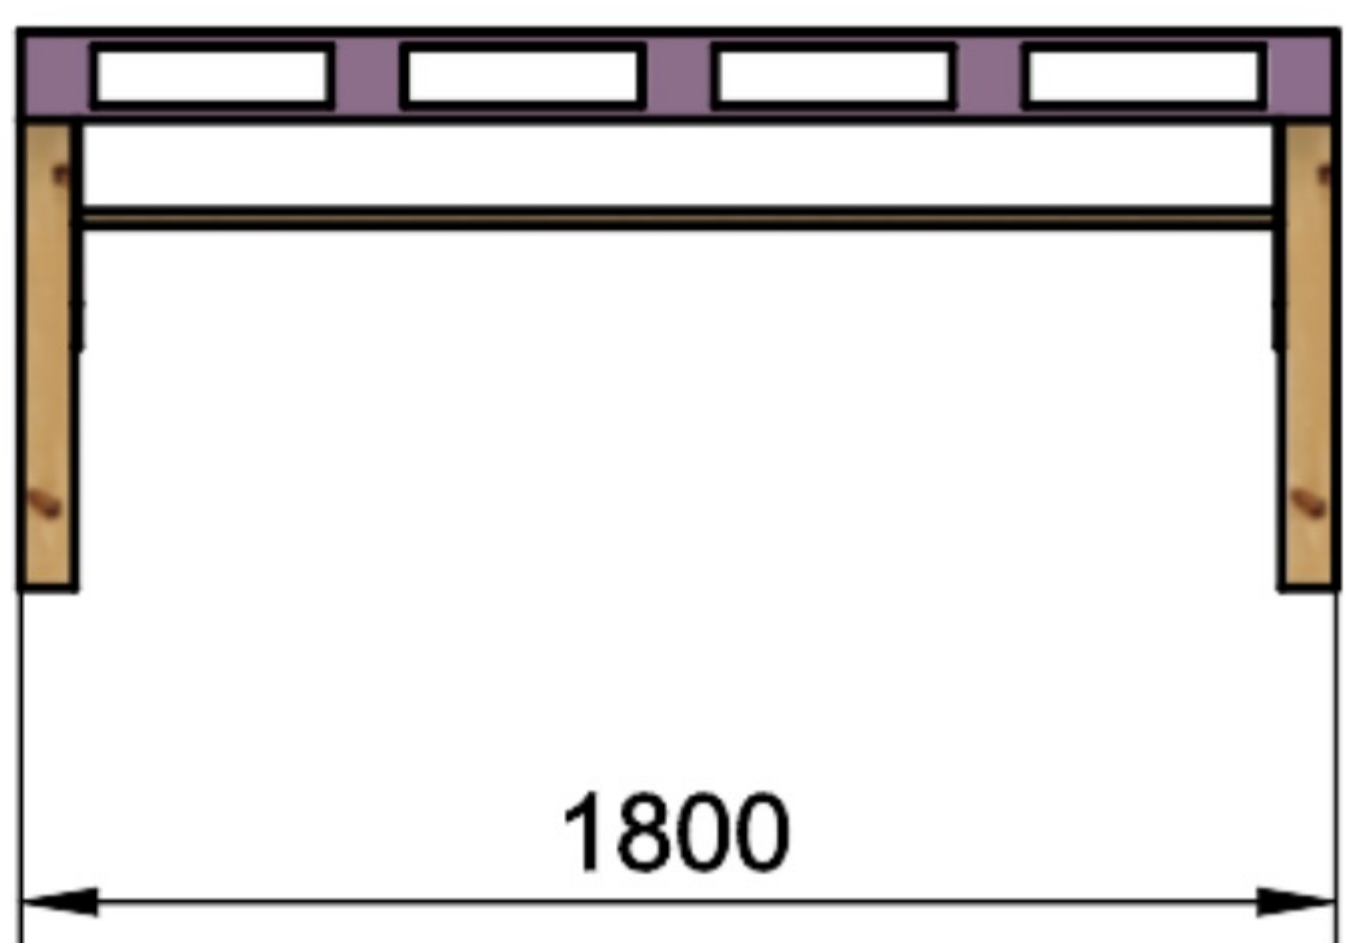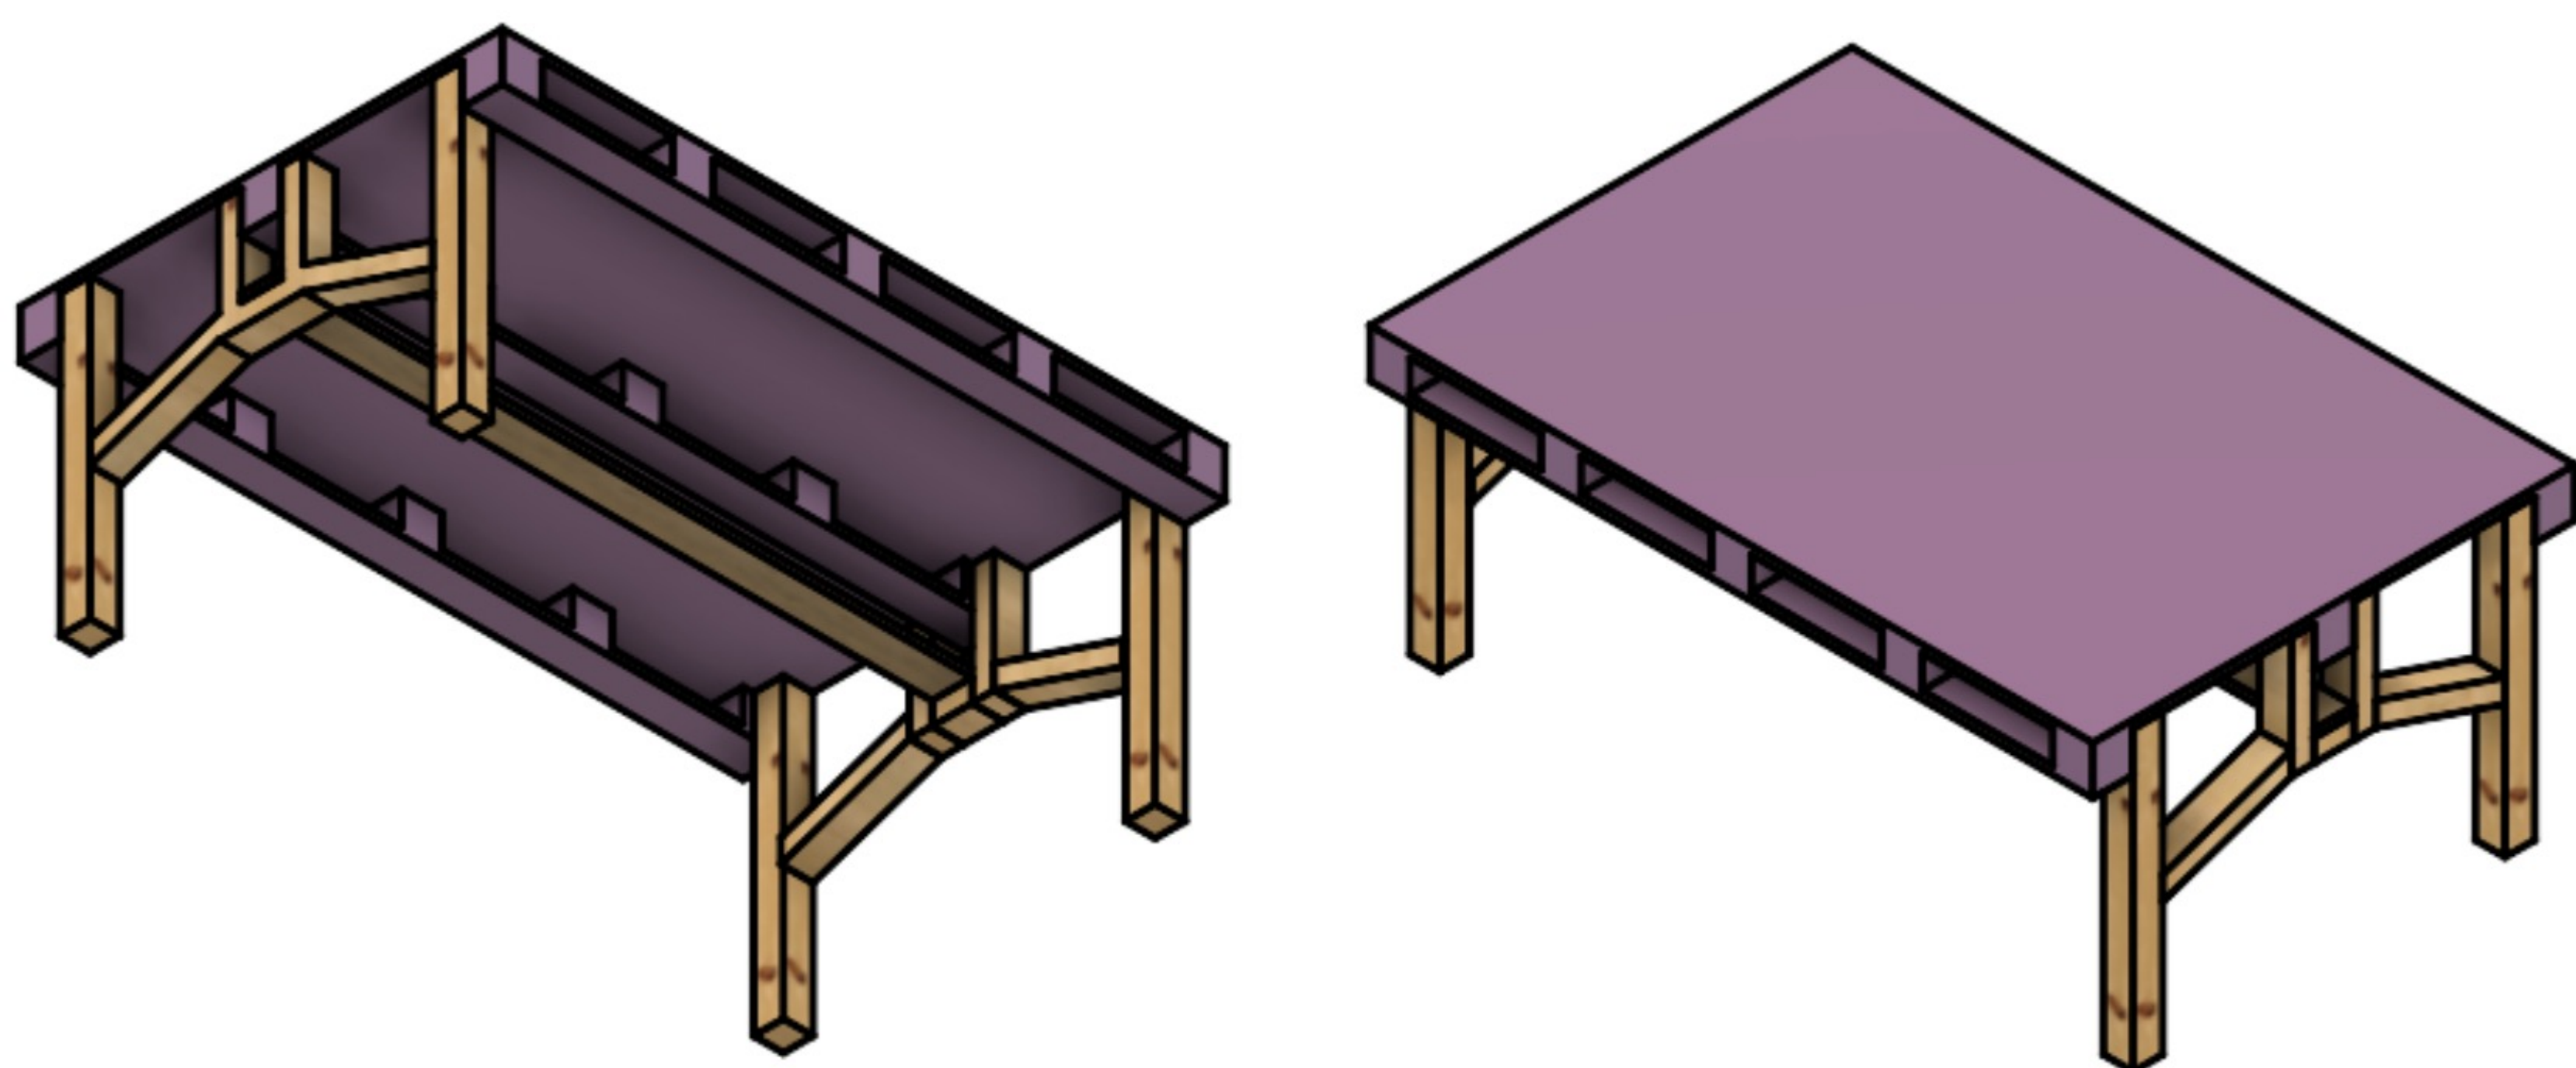


Gärungsstück
 4 pro Tisch
 24 Stück für 6 Tische
 aus 55x80 Stücken

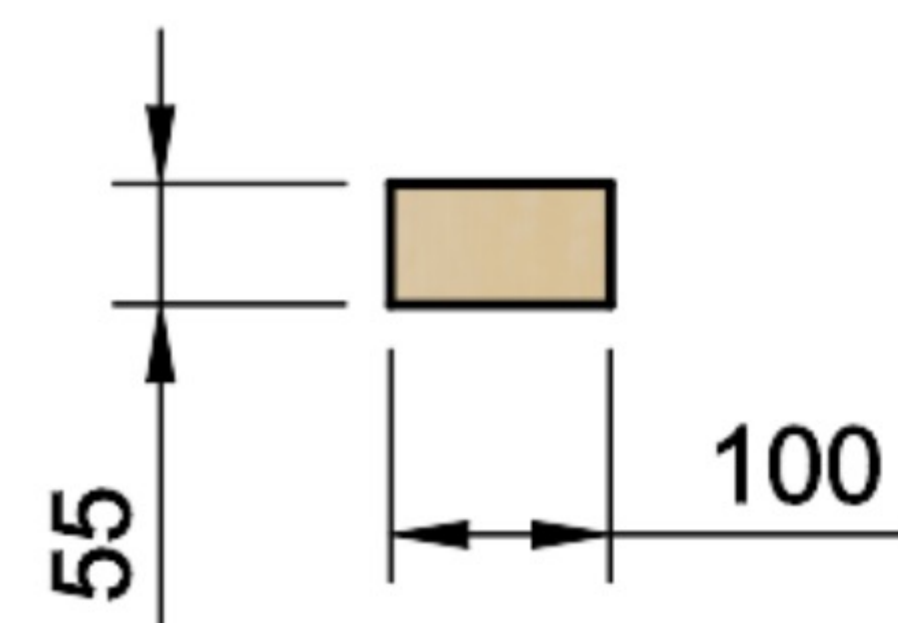


Zwischenstück
 2 pro Tisch
 12 für 6 Tische
 aus 55x80 Stücken

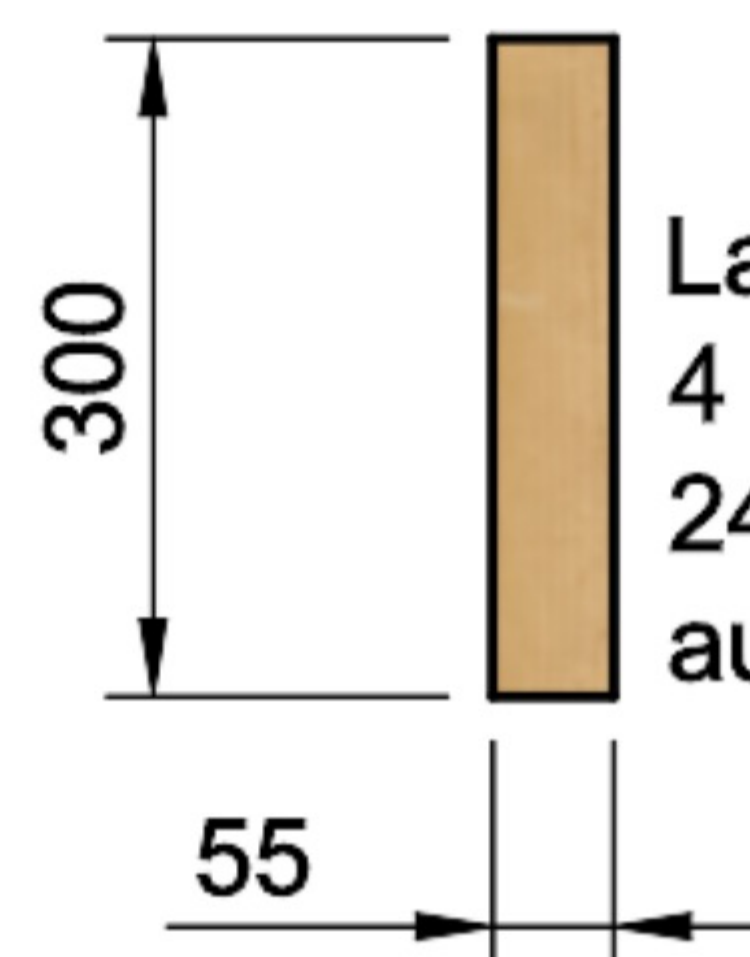

Lang&Hoch
 4 pro Tisch
 24 für 6 Tische
 aus 55x80 Stücken



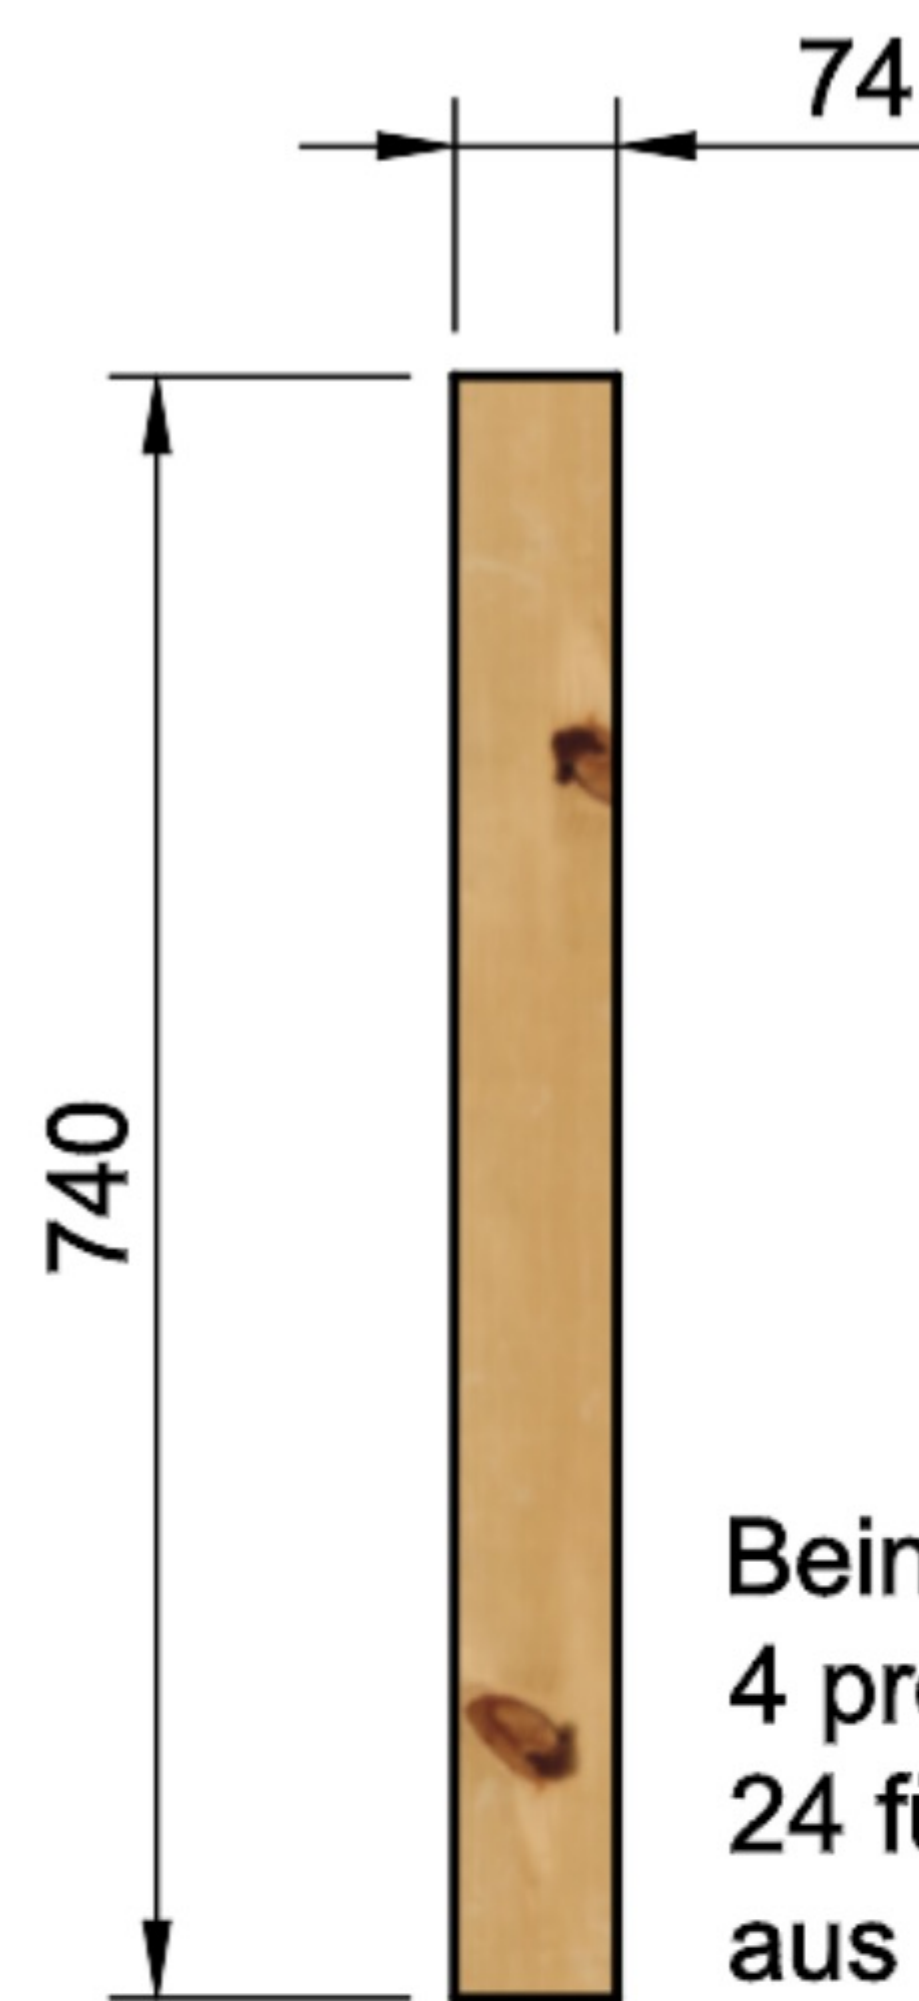


Beine
 4 pro Tisch
 24 für 6 Tische
 aus 74x74x2500 Holz

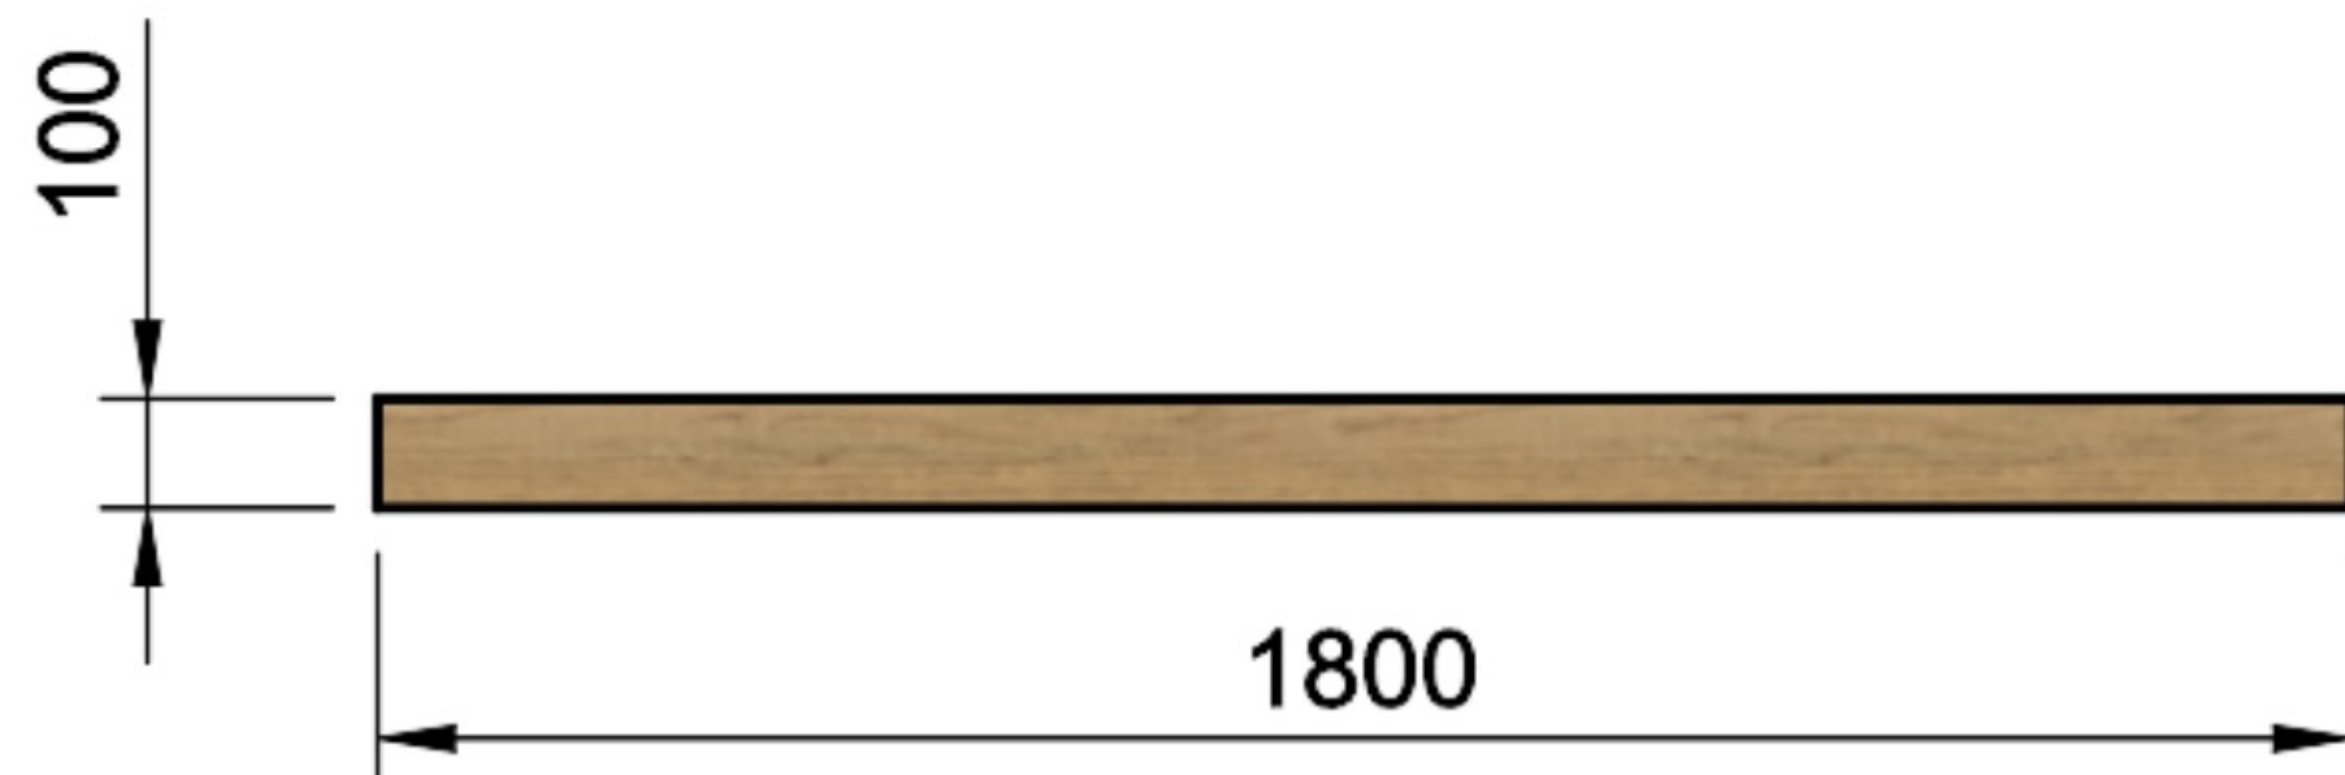

Längstverstebung
 1 pro Tisch
 aus Bank Rest-Paletten

LANGE TAFEL: AUSFÜHRUNGSPLANUNG BANK

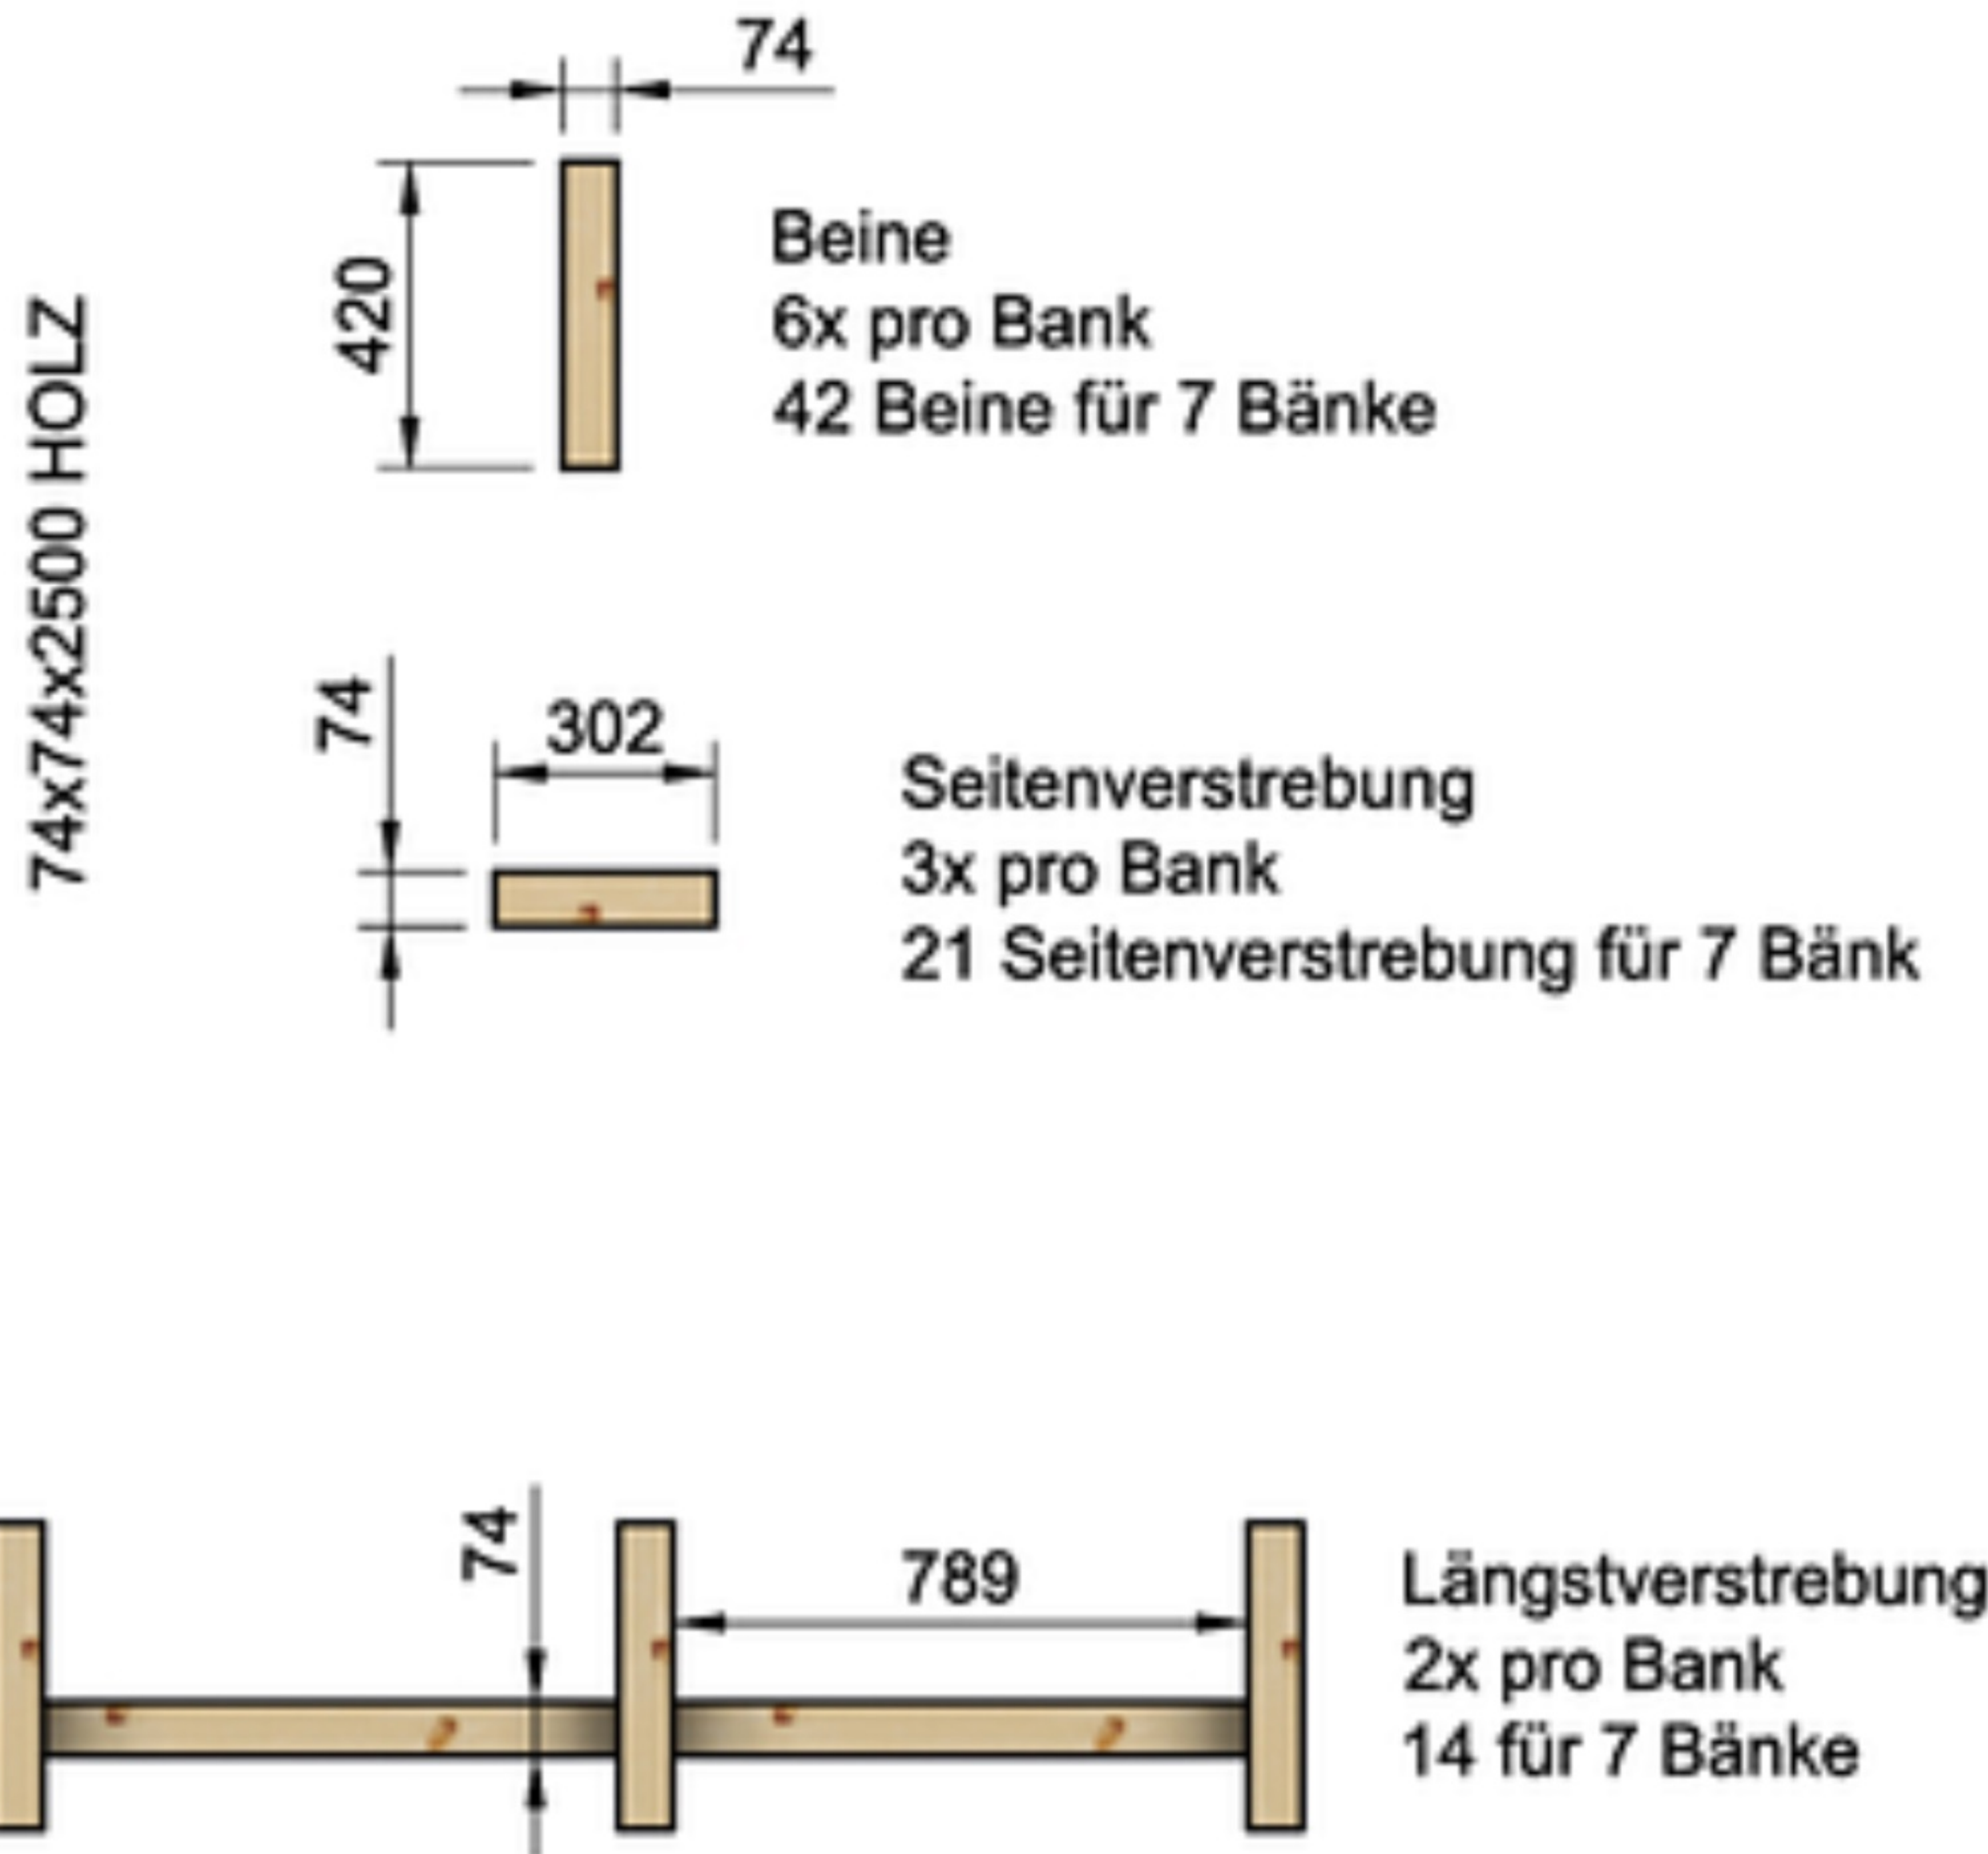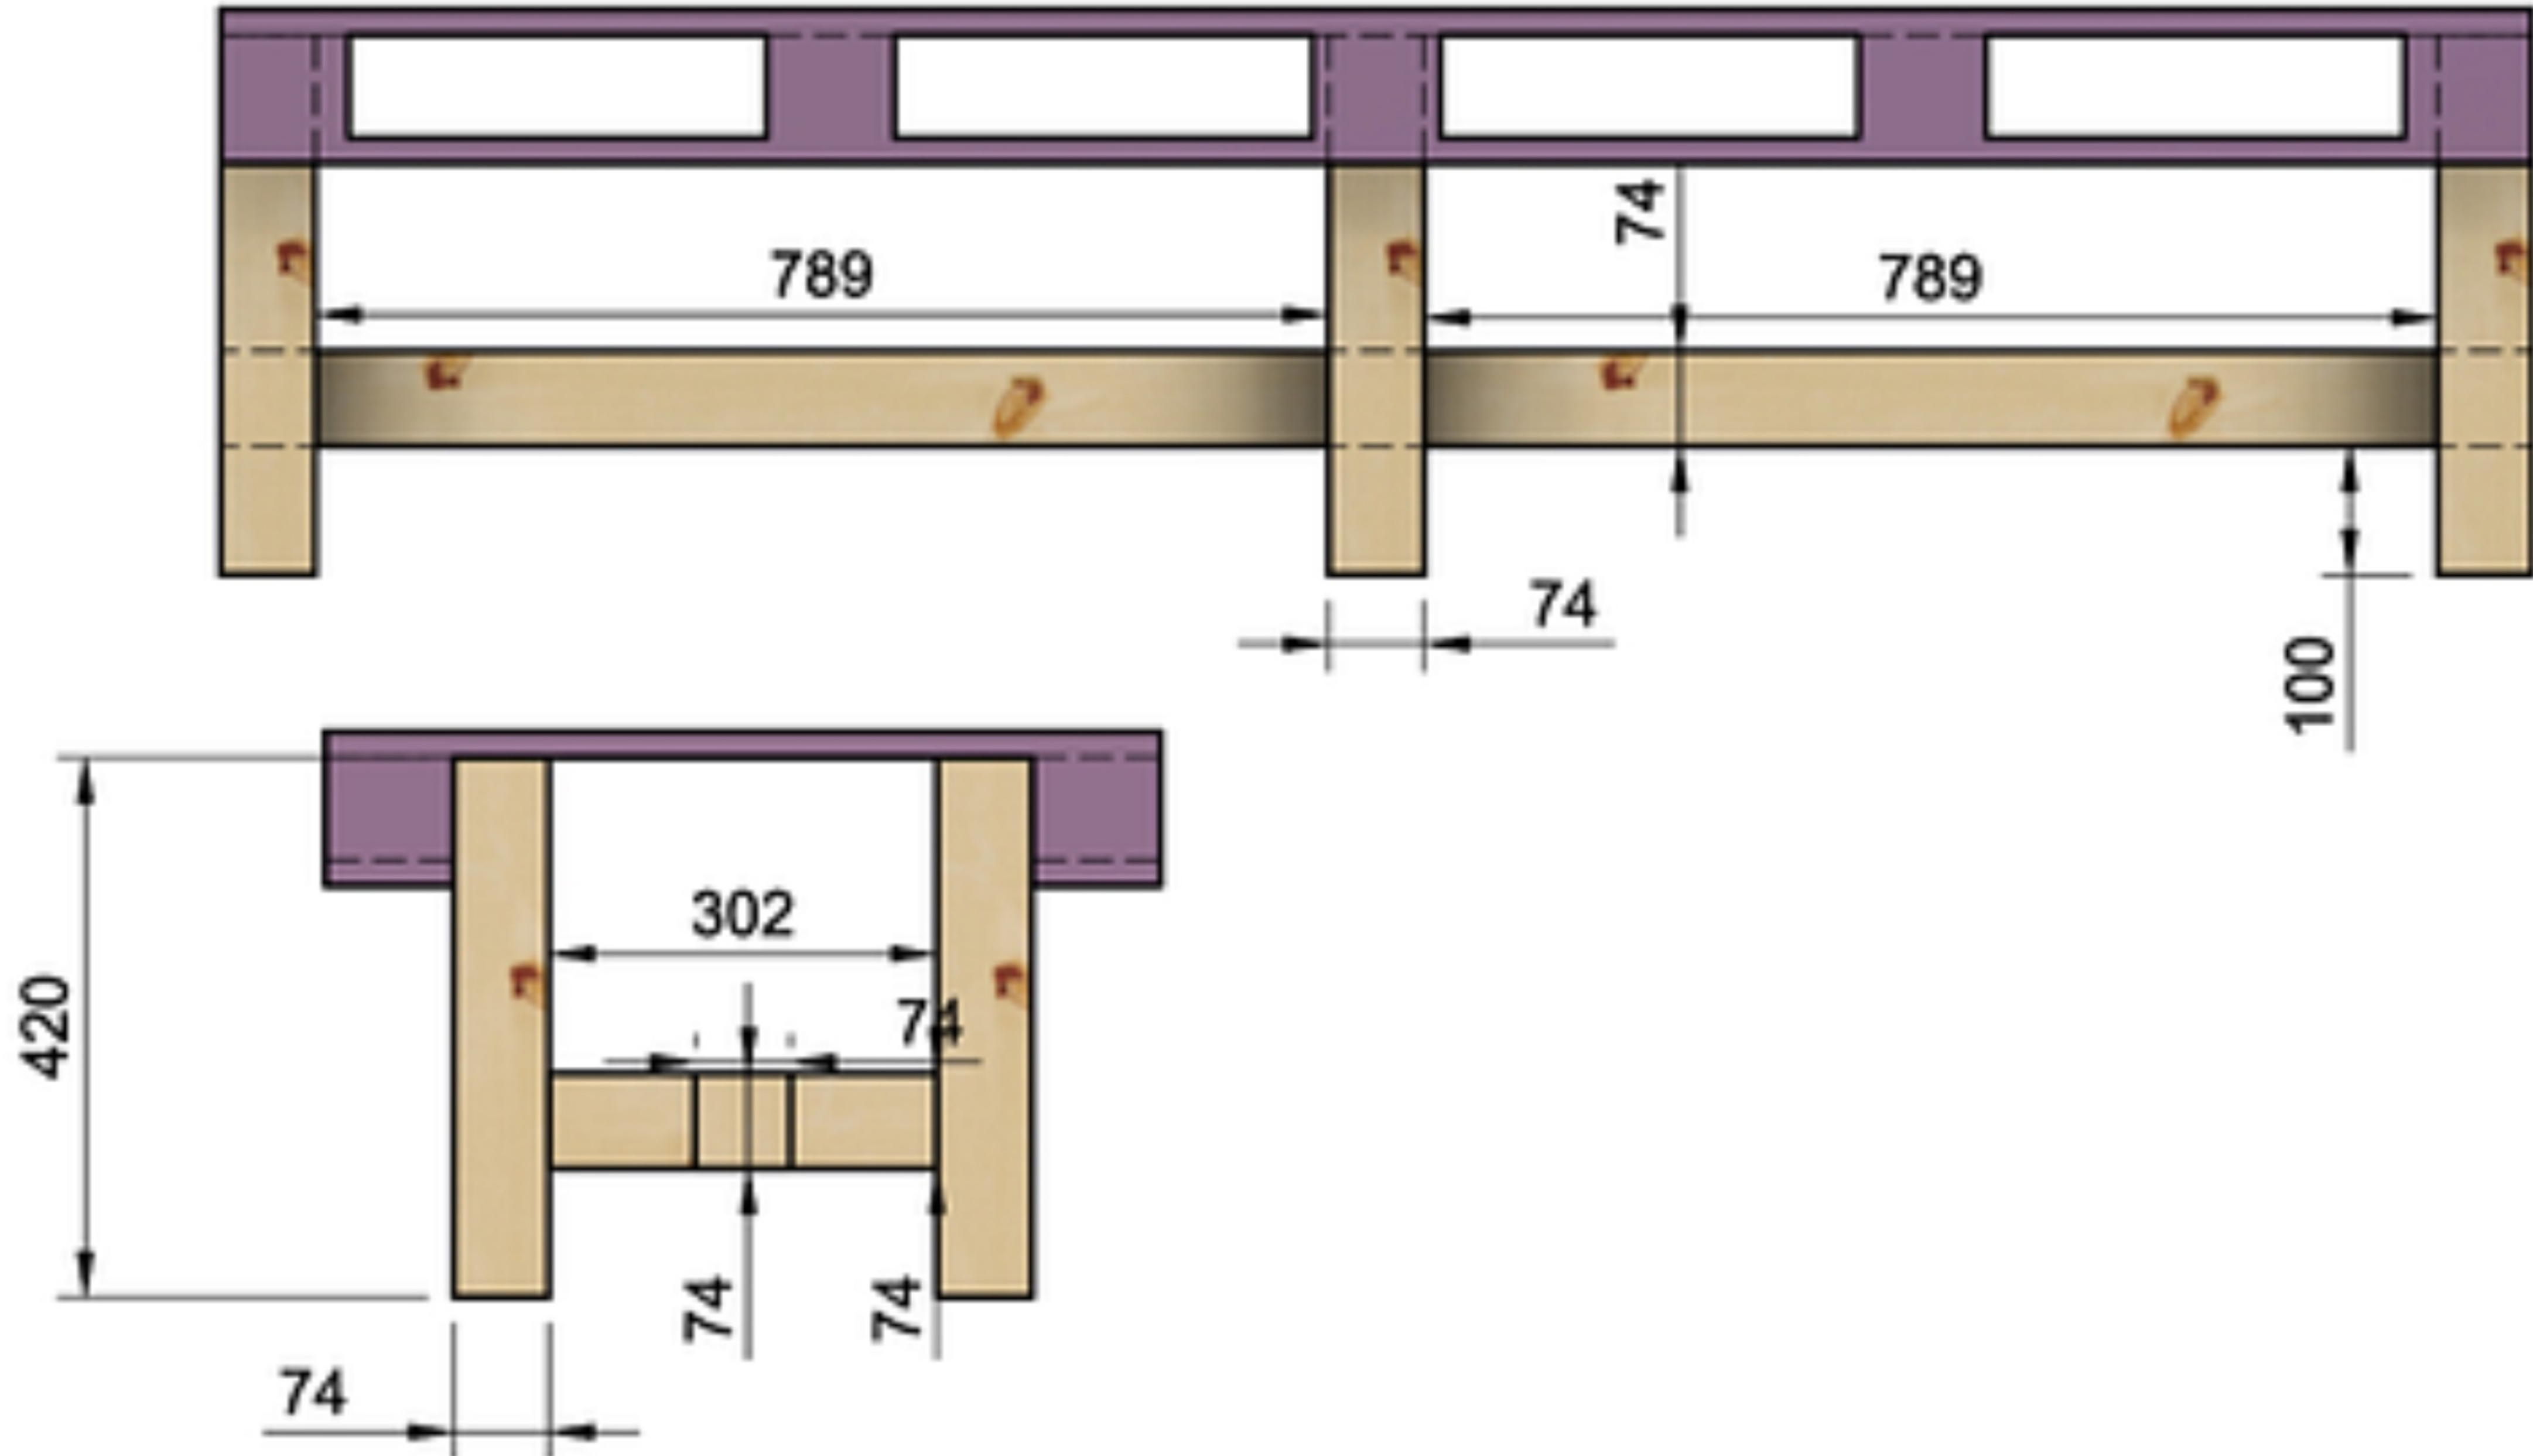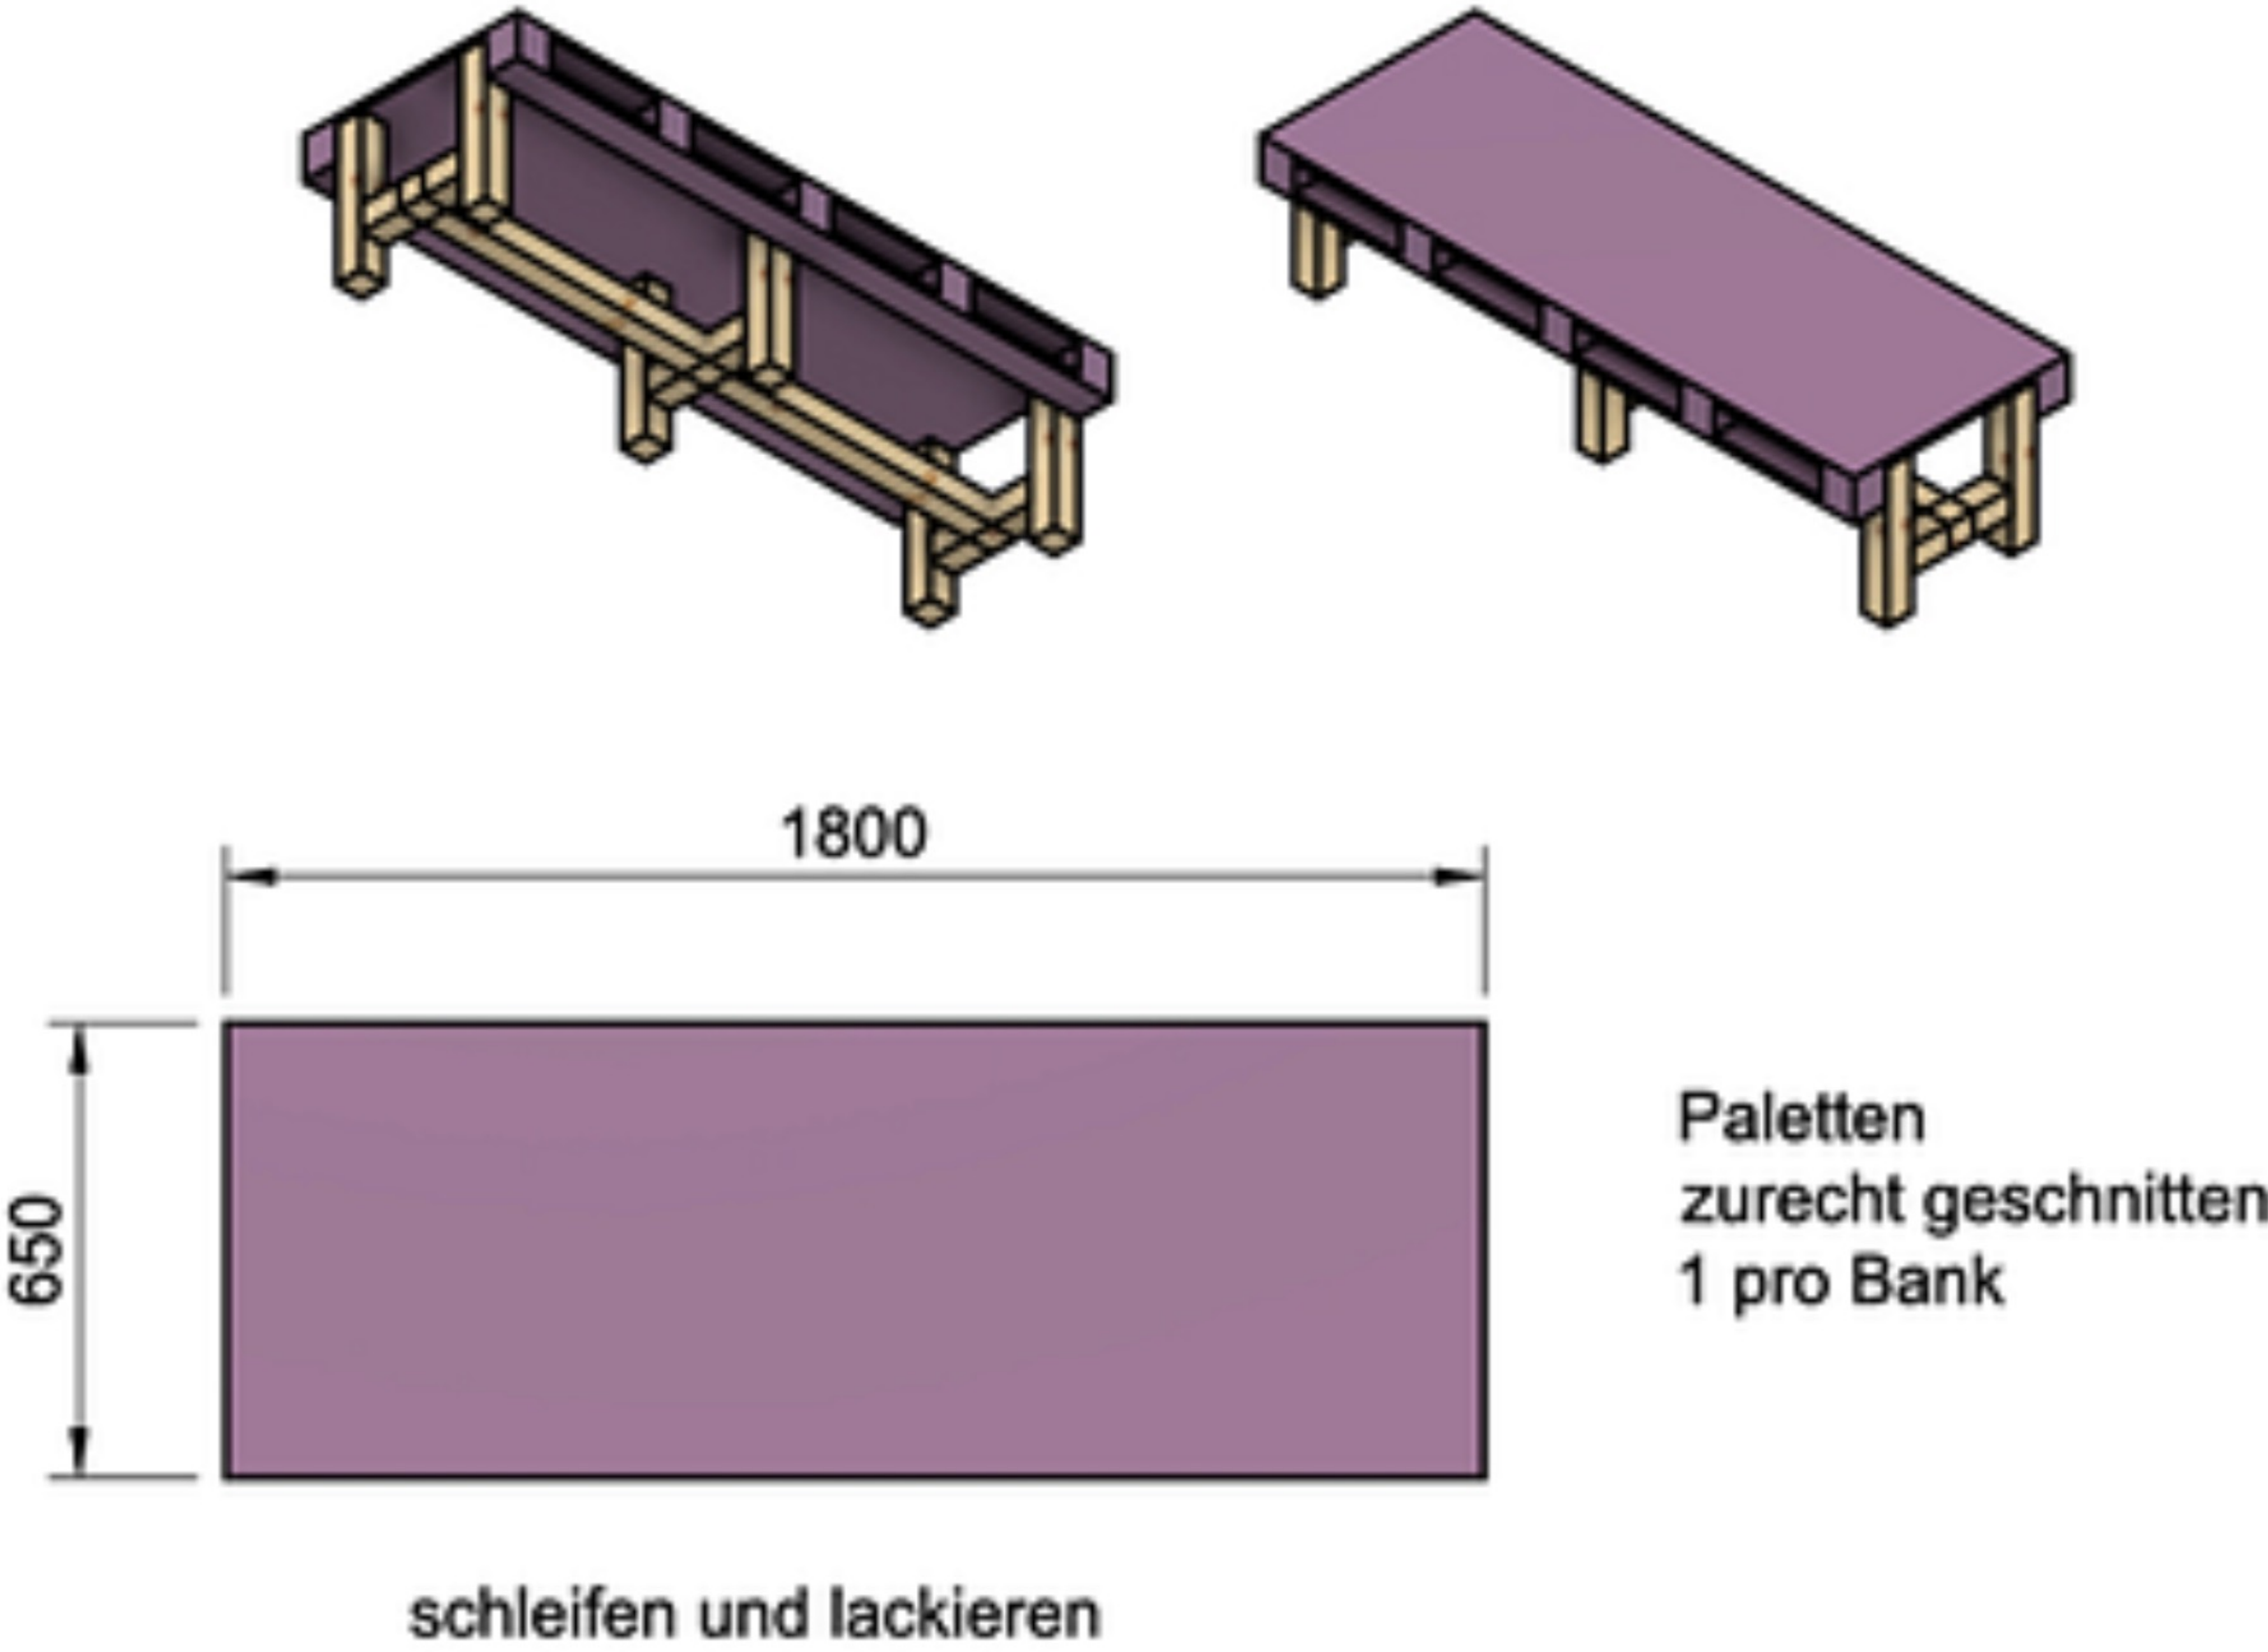


LANGE TAFEL: VISUALISIERUNG MIT INTEGRIERTEN BÄUMEN



Dieses Bild ist KI generiert

DEPAVING: SCHRITT FÜR SCHRITT


- 1 Pflaster entfernen
- 2 Sand und Erde ausheben (ca. 1m)
- 3 Bordsteine und Poller weg
- 4 neue Erde rein
- 5 Pflanzen einpflanzen (s. Pflanzungsplan)
- 6 Giessen

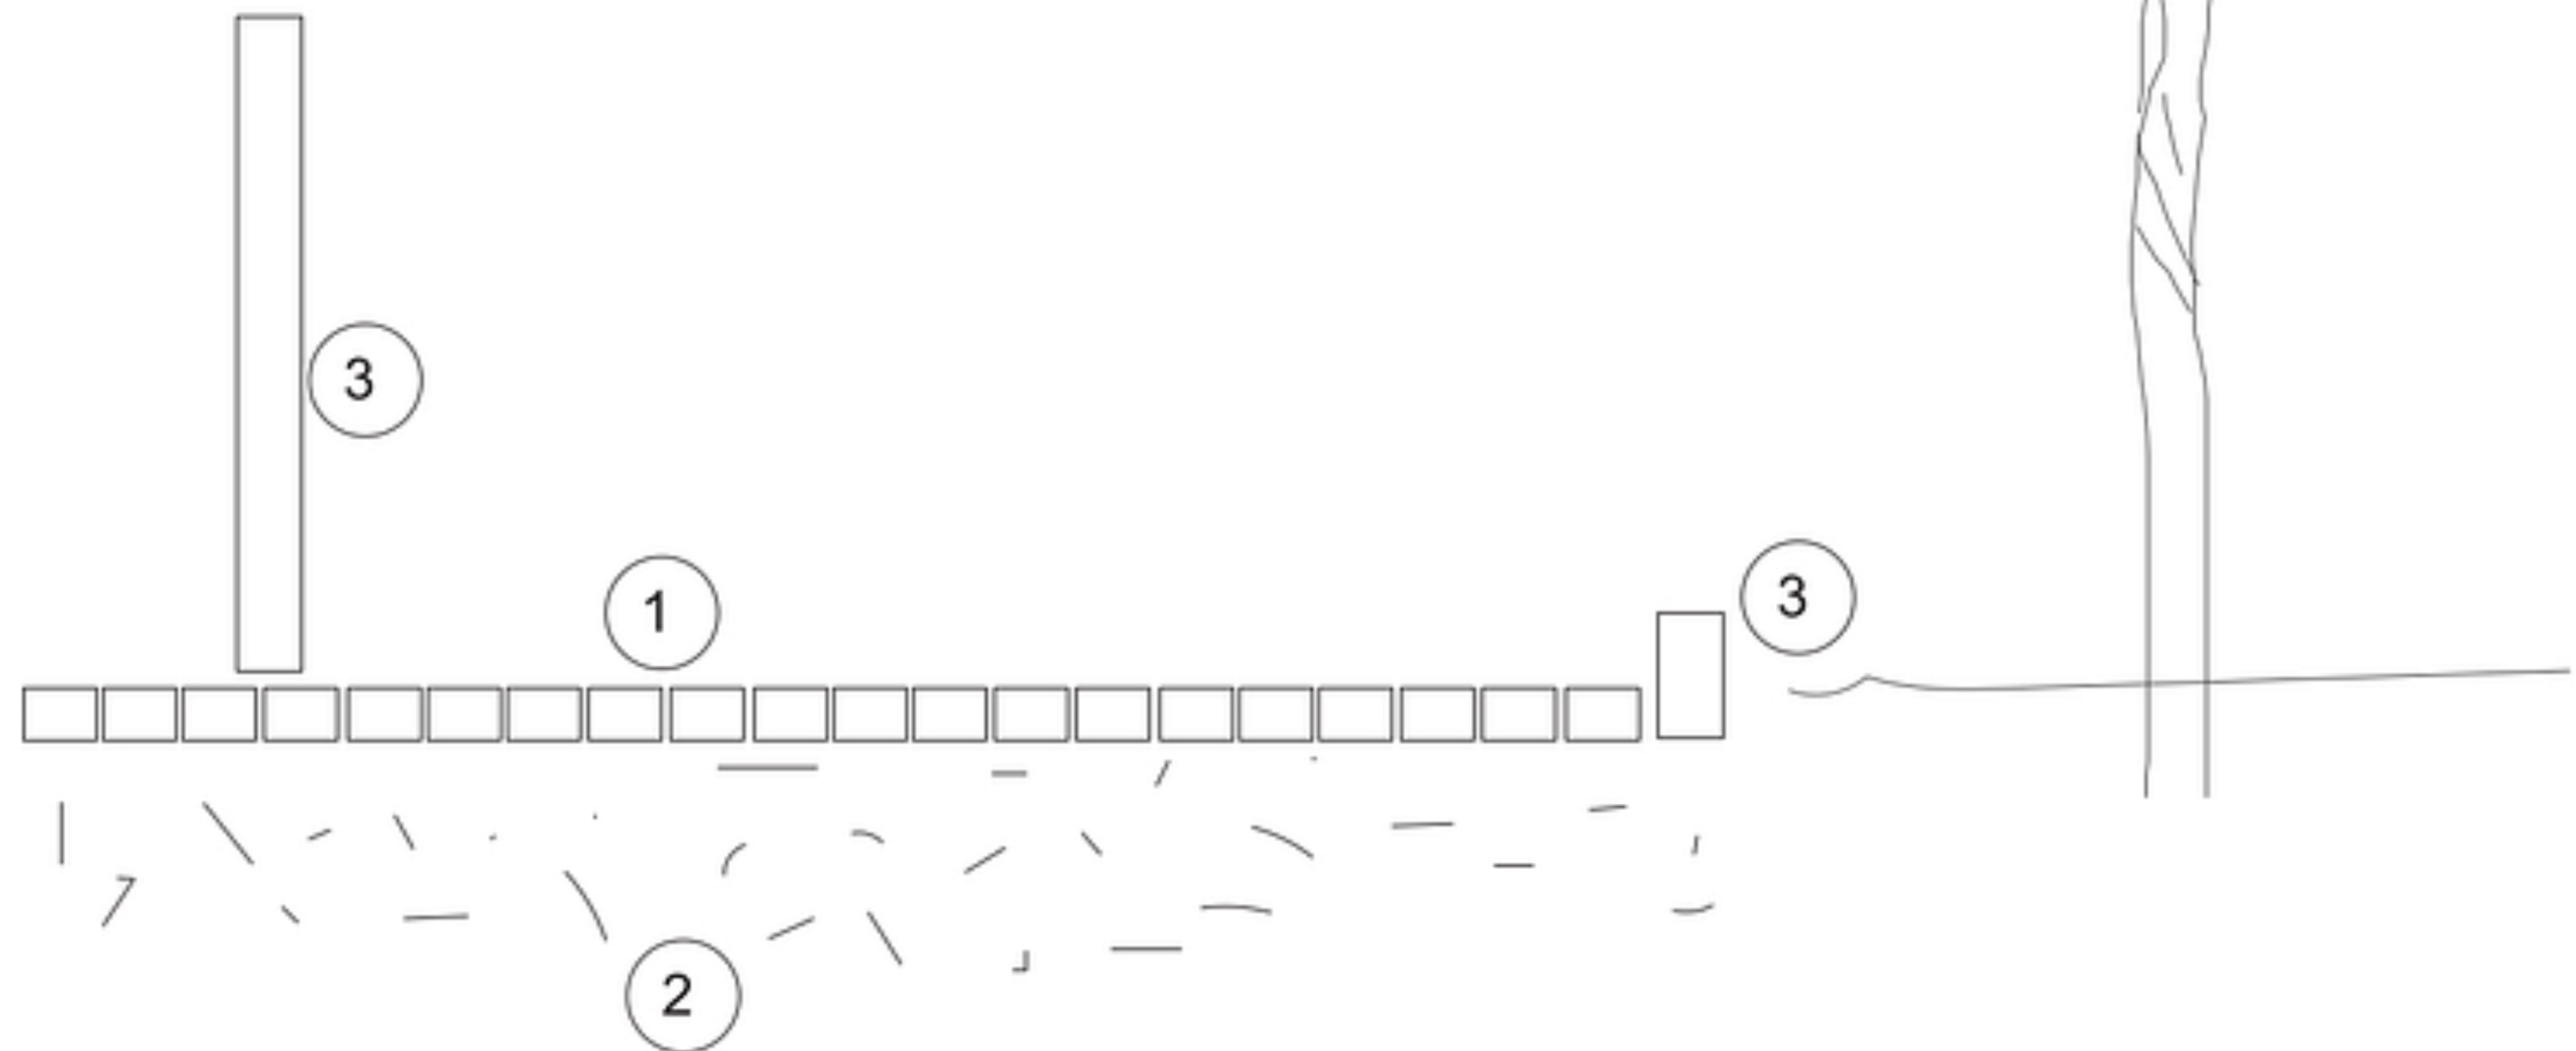




DEPAVING: BEPFLANZUNGSPLAN

Norden

Universitätsstr.



TEMPORÄRE STRAßENBEGRÜNUNG: AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAUMKÜBEL

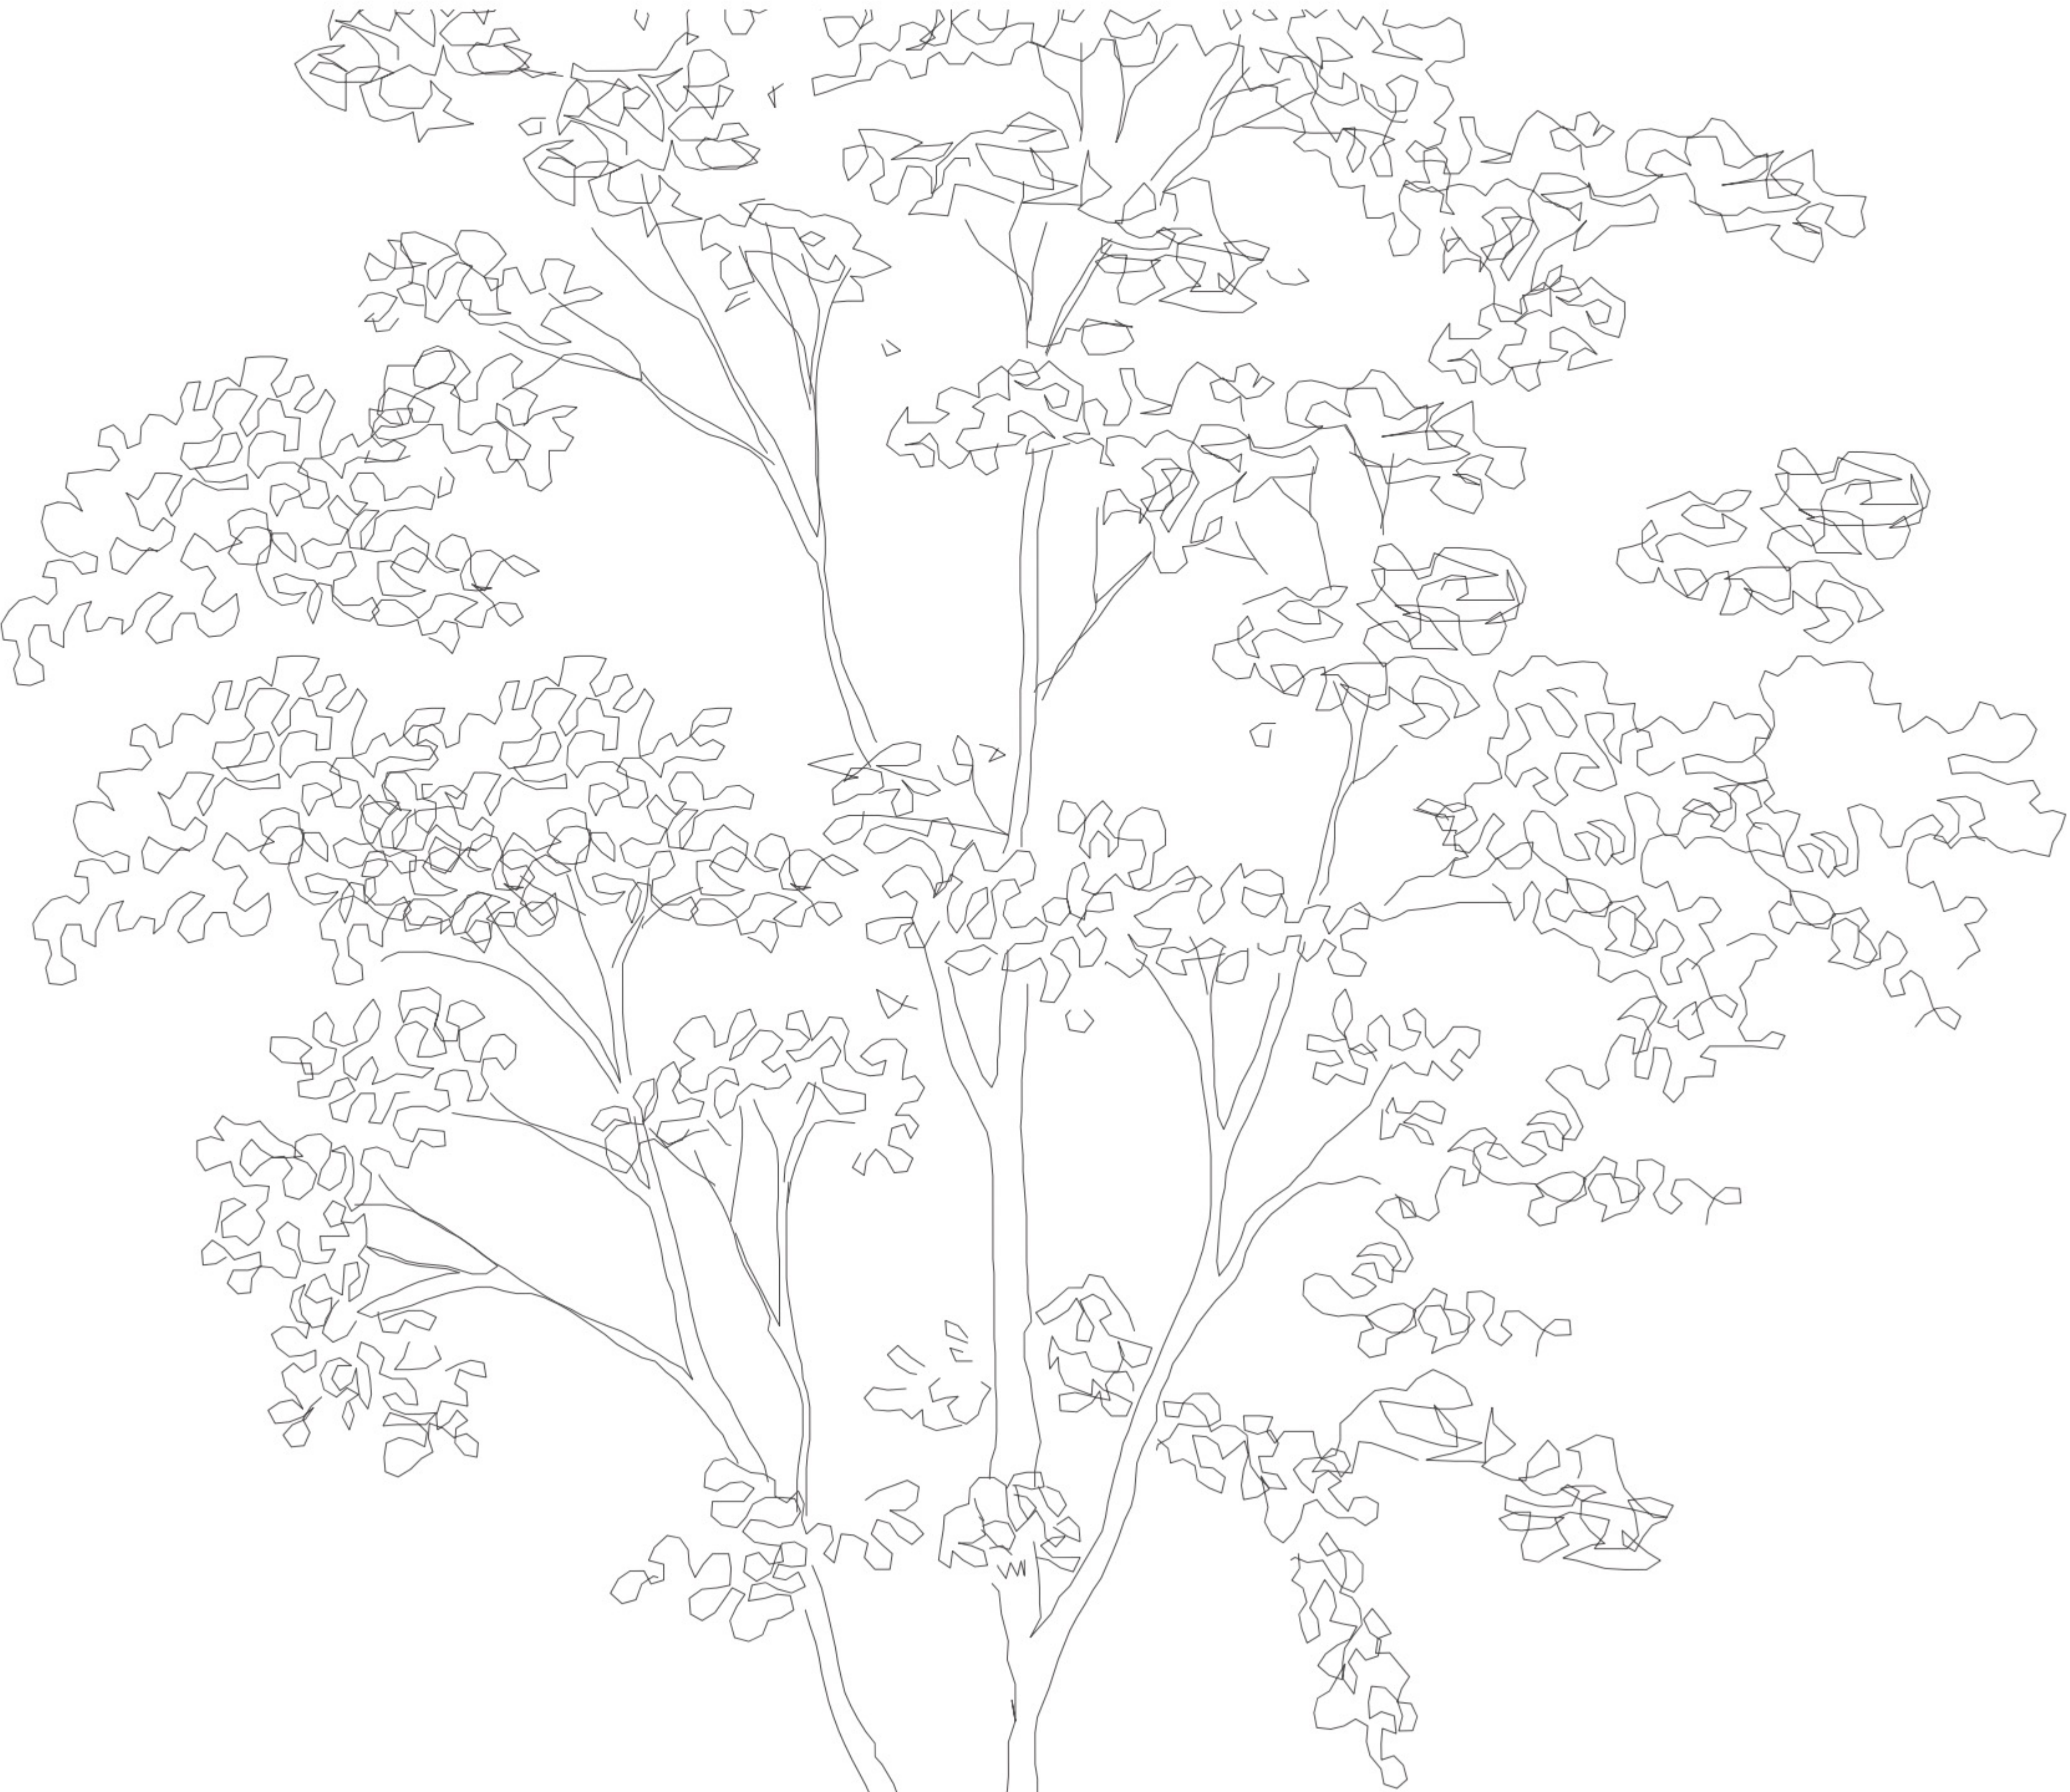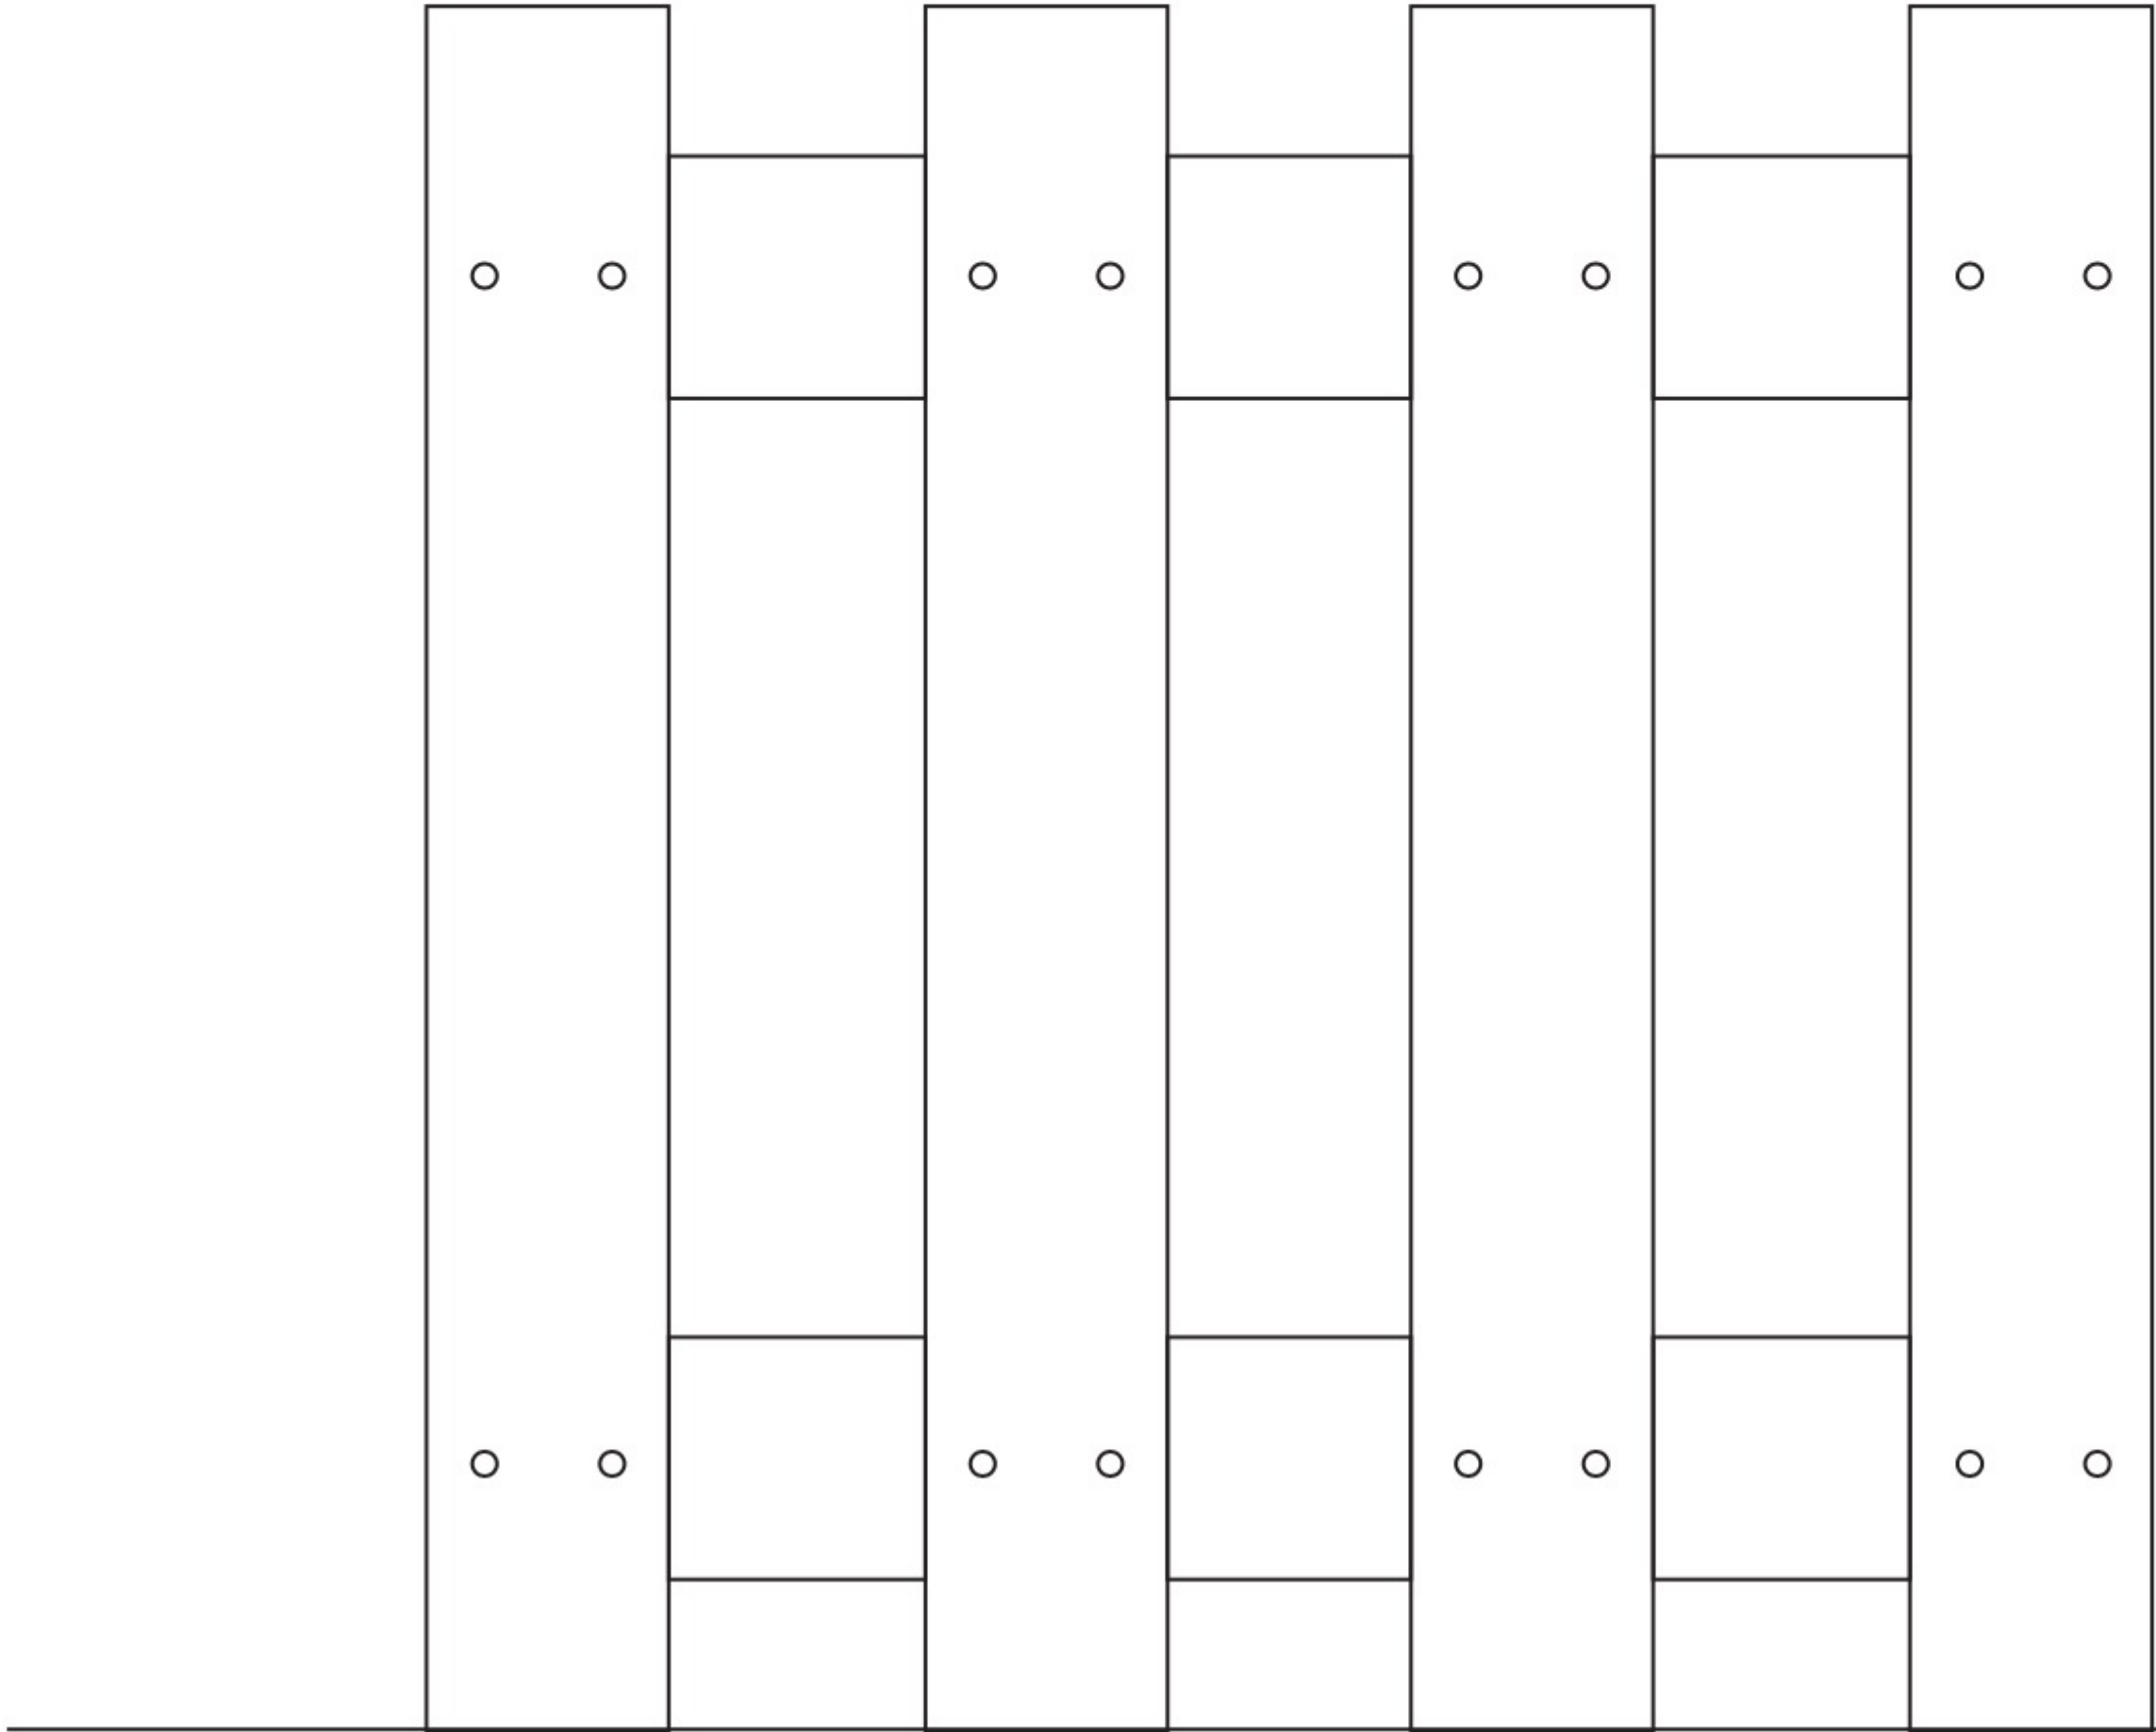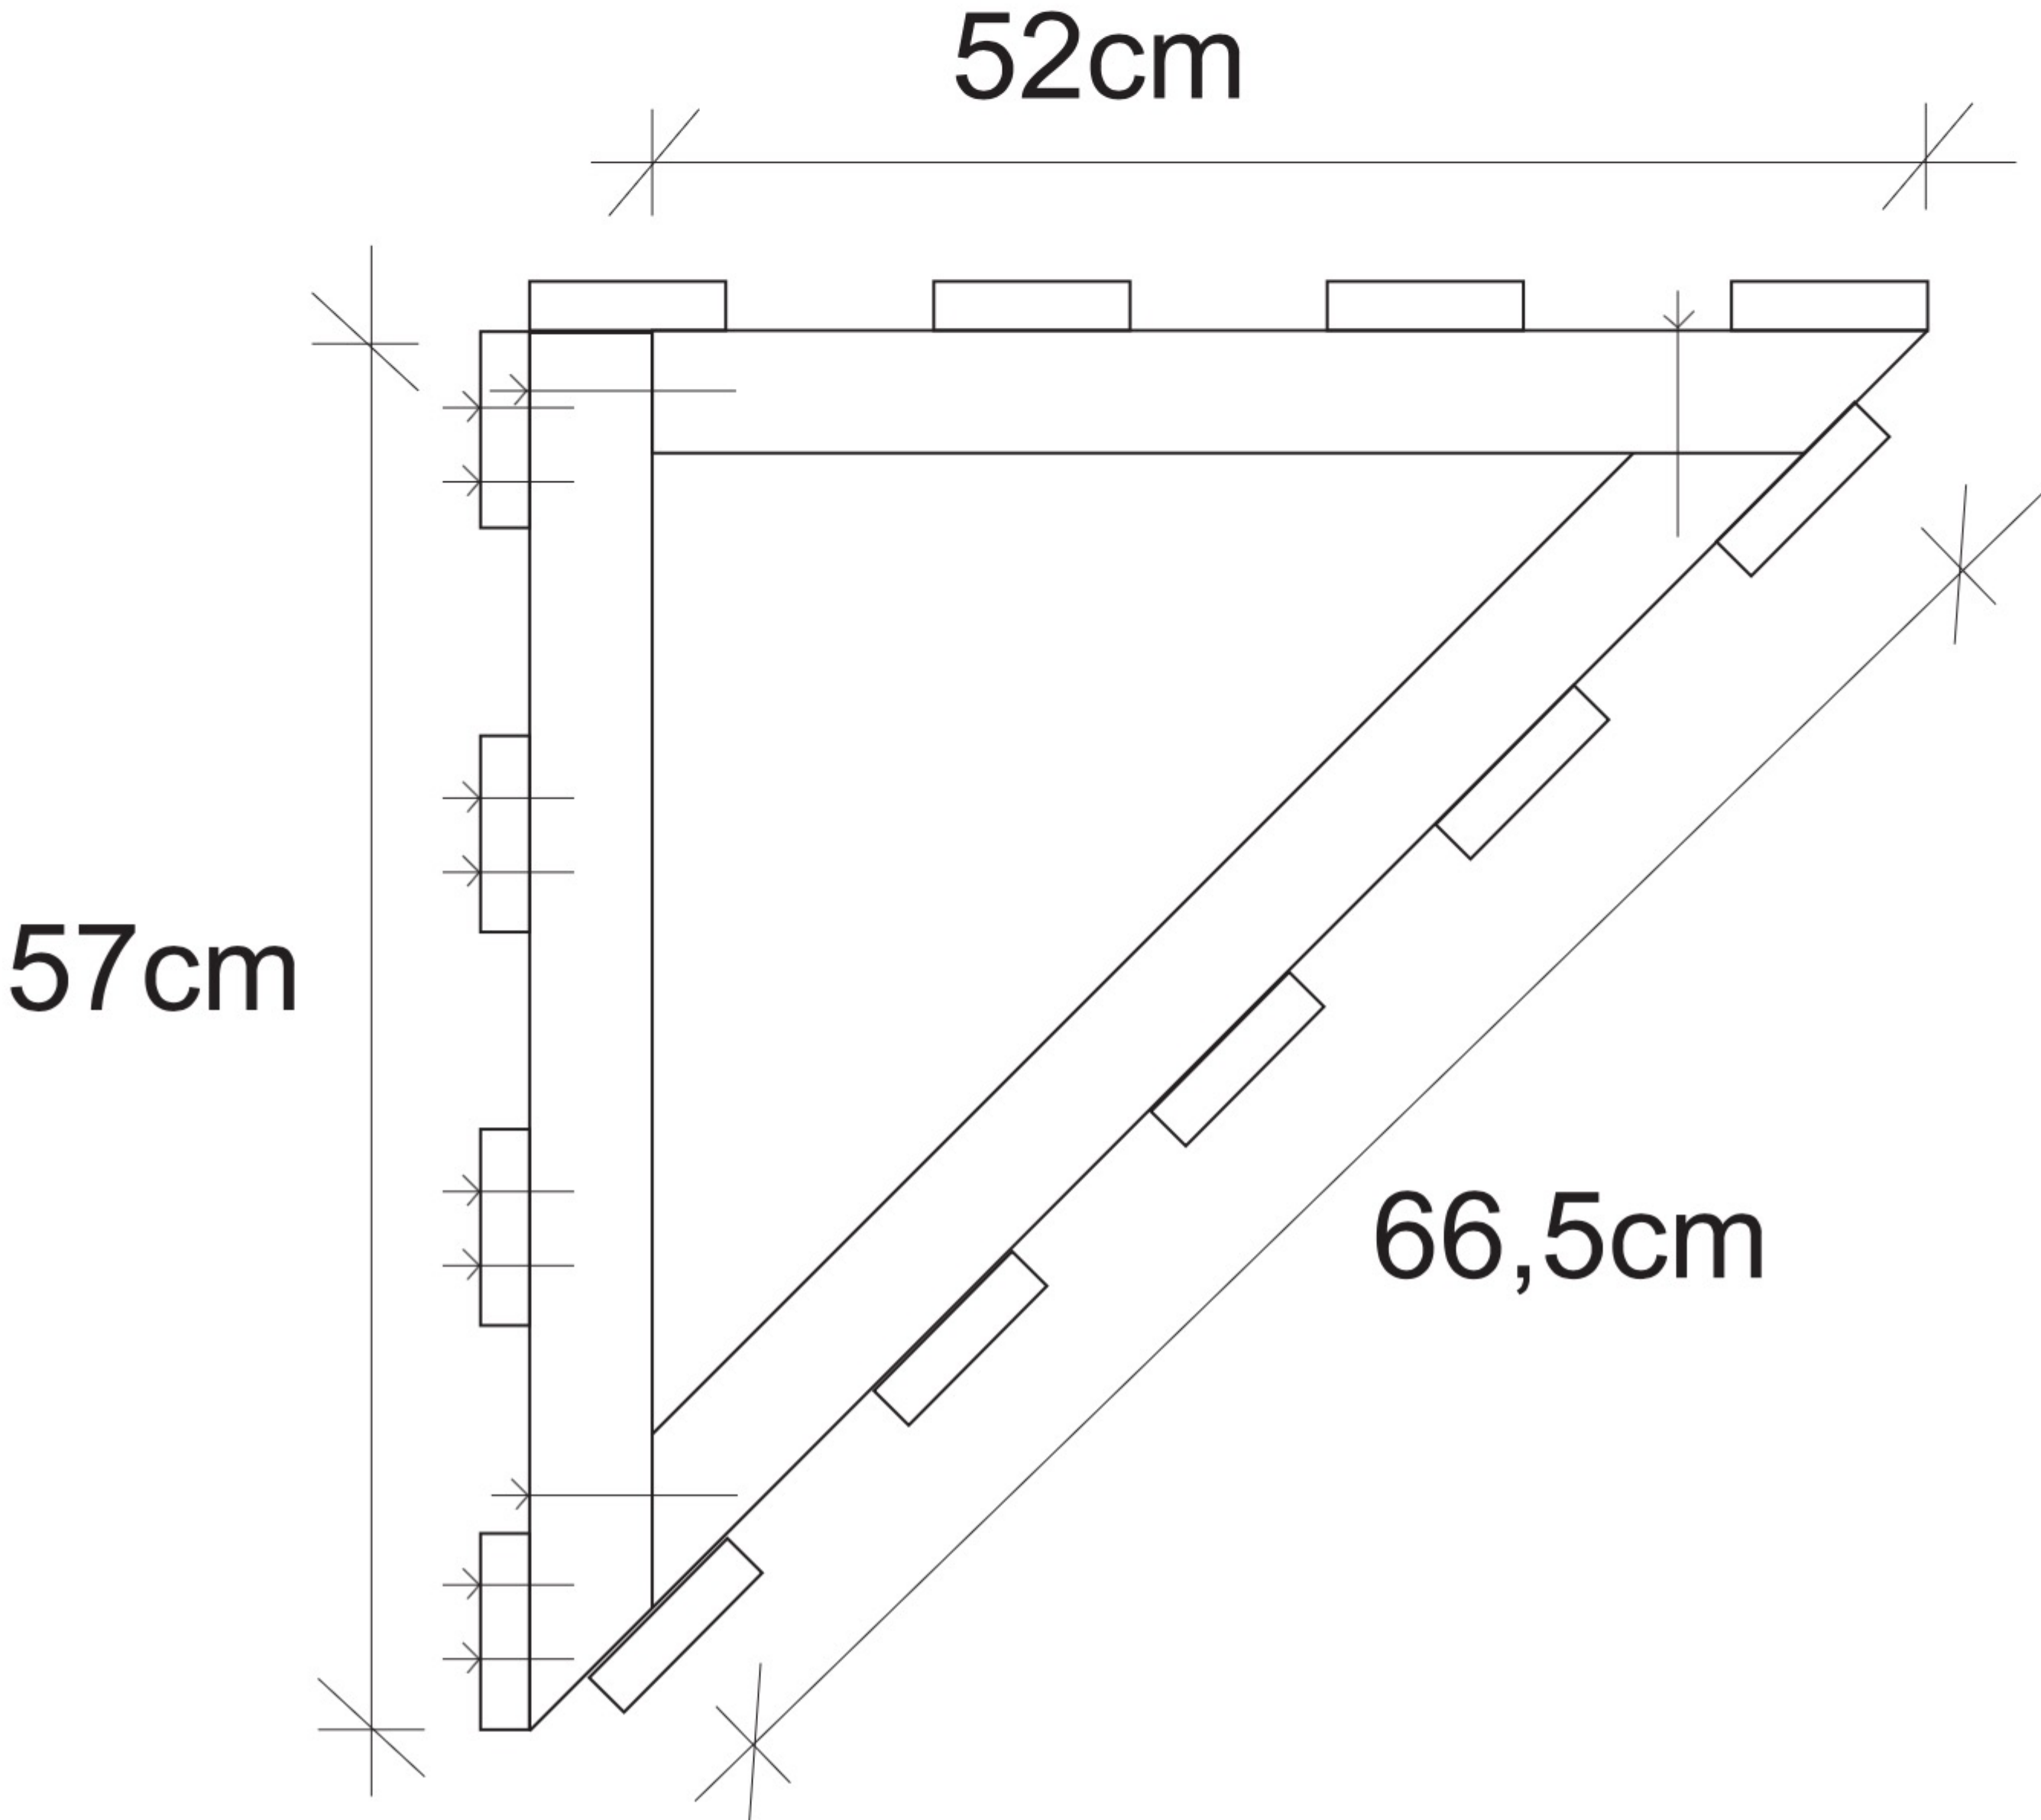


Folie klemmen

Baumsubstrat

Vlies

Drainage-Schicht
(Pflastersteine/Aushub)

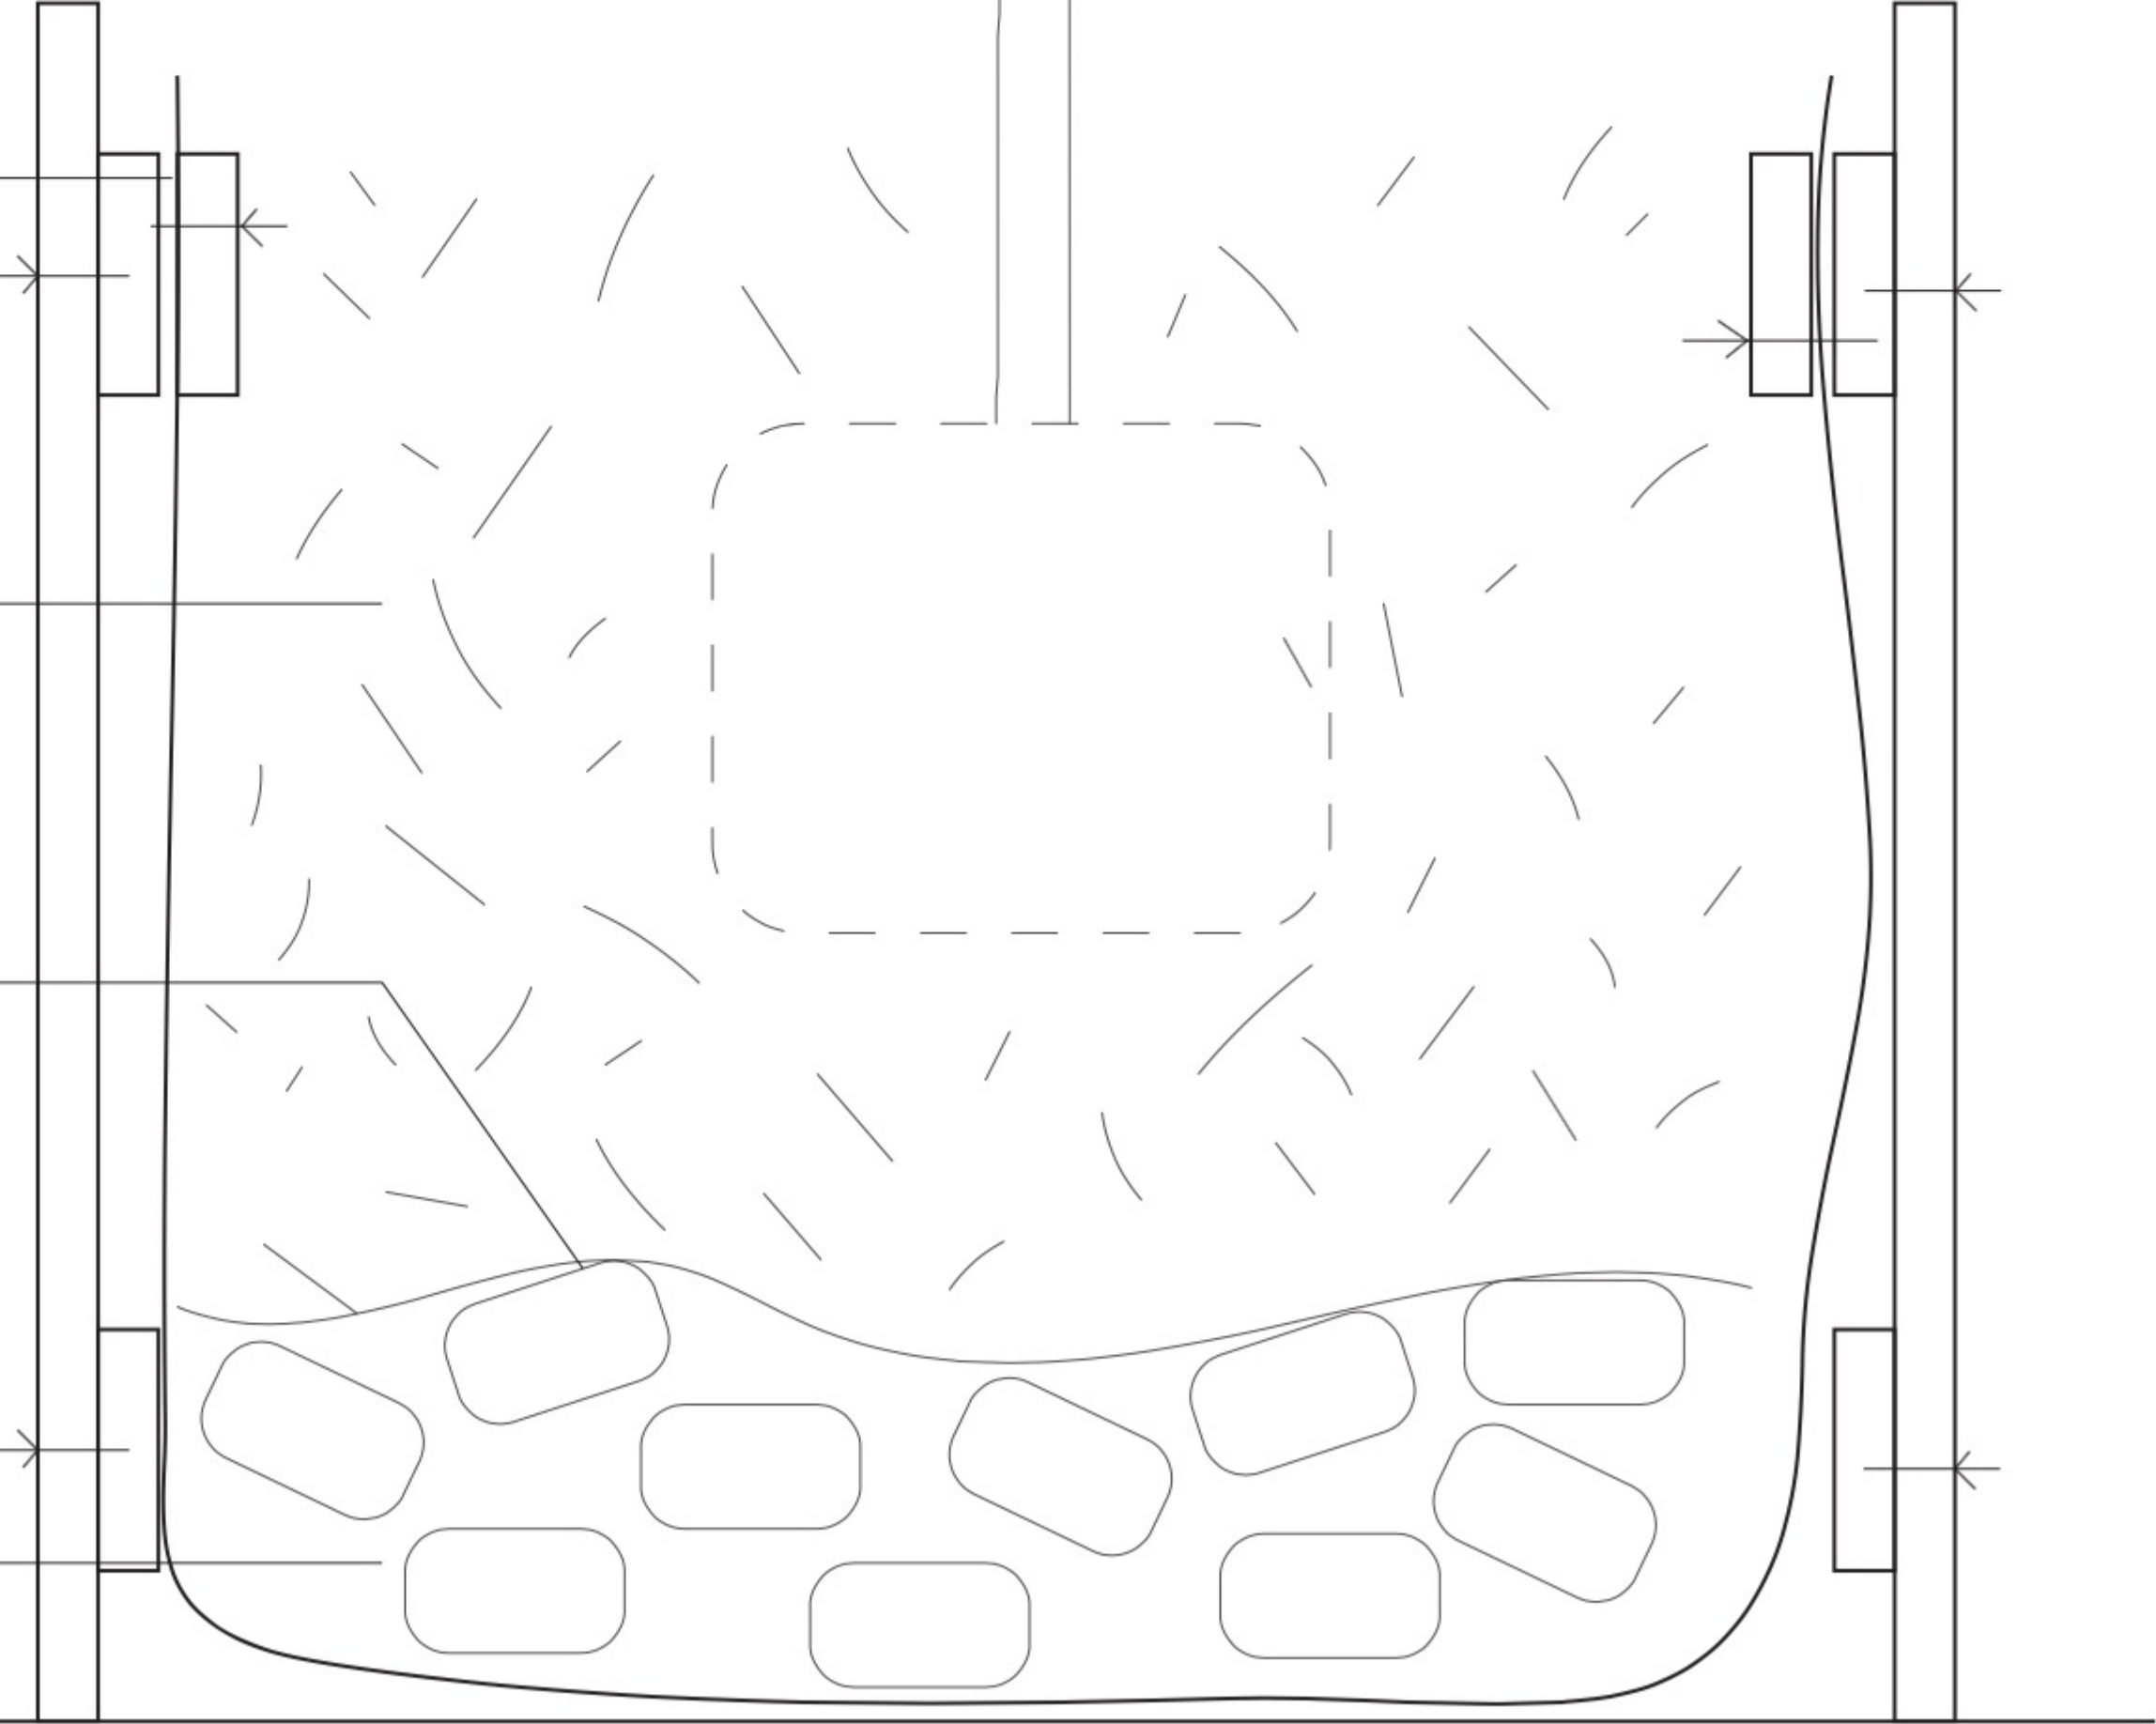

ZEITPLAN PARTIZIPATIVER BAUWORKSHOP

Bauworkshop		Eröffnungsparty											
MITTWOCH 22.04		DONNERSTAG 23.04		FREITAG 24.04									
8:00 - 10:00 Fläche einrichten, Werkzeug einrichten und Workshop aufbauen, Kübeldreiecke Werkzeug André Kreft & pavillon 		8:00 - 9:00 Abholung Hornbach (Essen Borbeck) Werkzeug & Material abholen Erde & Bäume kommen an (bis 13.00) 		8:00 - 10:00 Fläche einrichten, Maschienen einrichten und Workshop aufbauen + Sichten paletten 		9:00 - 10:00 Fläche einrichten, Maschienen einrichten und Workshop aufbauen							
10:00 - 11:00 Digi Lab Einführung & Einleitung Entwürfe & Gruppen kennenlernen bzw. Gemeinsamer Action Plan 		10:00 - 11:00 Materialsichtung & letzte Besorgungen <u>Tisch Prototyp</u>		10:00 - 13:00 <u>Pflanzkübel fertigstellen</u> <u>1 Drainage (2pax)</u> <u>2 Vlies (2 Pax)</u> <u>3 Erde (2pax)</u> <u>4 Bäume (3 Pax)</u> <u>5 mehr Erde (3 Pax)</u>		10:00 - 13:00 Bauworkshop Lange Tafel Teil 2b - <u>Unterkonstruktionen</u> <u>24 Gärungsteile Tische (55er) (2pax + Linus)</u> <u>36 gerade Verstreburger Tische (55er) (2pax + Linus)</u> <u>40 gerade Verstreburger (2 Pax+ Linus)</u>		10:00 - 13:00 Entsiegelungs-workshop Schritt 3- 6: <u>3 Boardsteine & Poller</u> <u>4 mit Erde füllen</u> <u>5 Stauden pflanzen</u> <u>6 Gießen</u>		10:00 - 13:00 Bauworkshop Lange Tafel Teil 4 - <u>letzte Schliffe und Positionierungsamt</u> Pflanzkübel			
11:00-12:00 Kübeltruppe trifft sich Einführung Werkzeug und Material Planung Pflanzkübel		11:00-12:00 Baugruppe Werkzeugeinführung											
12:00 - 13:00 Mittagessen in der Mensa 		13:00 - 14:00 Mittagessen in der Mensa 		13:00 - 14:00 Lackierte Paletten prüfen + 30 Pax kommen aus LehrVA (c.a. 14.30)		13:00 - 14:00 Mittagessen in der Mensa 				13:00 - 14:00 Aufbau Eröffnungsparty Campus Street Lab			
14:00 - 18.00 <u>Pflanzkübel bauen</u> <u>80 Seitenteile Pflanzkübel organisieren (3 Pax)</u> <u>10 Pflanzkübel Dreiecke sägen (2 Pax + Kristin)</u> <u>Dreiecke und Seitenteile (4pax in 2 Teams) = 5 Pflanzkübel</u> <u>5 Pflanzkübel mit Folie versehen und verschrauben (3pax + Kristin)</u> 		14:00 - 16.00 Bauworkshop Lange Tafel Teil 1 - Tische und Bänke vorbereiten <u>6 Tisch-Paletten + 8 Bankpaletten Schleifen (2pax)</u> <u>8 Paletten kürzen (2 Pax + Linus)</u> <u>14 Paletten lackieren (4 Pax)</u> 16:00 - 18:00 Bauworkshop Lange Tafel Teil 2a - Unterkonstruktionen <u>24 Tischbeine + 48 Bänkebeine (74er) UK zuschnitt (2pax + Linus)</u> 		14:00 - 18.00 Entsiegelungs-workshop Schritt 1-2: <u>Pflastersteine entfernen und bis zu 1m ausbuddeln</u> (so viele Leute wie möglich)		14:00 - 18.00 Bauworkshop Lange Tafel Teil 3 - <u>Tische und Bänke zusammensetzen</u> <u>verschrauben, verschrauben, verschrauben</u> (6pax in 2 Teams + Linus)		14:00 - 18:00 Eröffnungsparty Campus Street Lab mit Dj Sets, Musik und Getränke Tischtennis Schach usw.					
18:00 ENDE + Paletten Trocknen (mit Flutterband unter der Brücke absperren) + <u>Team baut Prototypen</u> Aufräumen und Maschinen wegräumen		18:00 ENDE Aufräumen und Maschinen wegräumen		18:00 ENDE, ABBAU									

- = David (Mi,Do,Fr) = Kristin (Mi,Do,Fr) = Linus (Mi,Do,Fr)
- = Kai / IMOBIS (Mi, Do [bis Mittag]) = Kaethe / IMOBIS (Mi, Do, Freitag [ab 12]) = David / IMOBIS (Mi, Do, Fr)
- = Adrian / Stadt Essen (Mi [ab 12], Do, Fr.)



IMPRESSIONEN VOM BAUWORKSHOP



AUFENTHALTSINFRASTRUKTUR



ENTSIEGELUNG









PARTIZIPATIVER BAUWORKSHOP CAMPUS.STREET.LAB

Auftragnehmer: ARGE:3000 Architekten GmbH,
vertreten durch Kristin Lazarova & David Nil Morsi

Subauftrag: Linus van Doren

Fotos: © David Nil morsi

Idee und Konzept: Kristin Lazarova & David Nil
Morsi

Umsetzung: Kristin Lazarova, David Nil Morsi &
Linus van Doren
